




ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
0		DR-L1128 Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución			1167 days	Wed 10/24/18	Thu 4/13/23	\$155,000,000.00								
1	1	Componente 1: Construcción y habilitación de nuevas subestaciones y redes asociadas			842 days	Tue 11/12/19	Wed 2/1/23	\$63,445,285.74								
2	1.1	Nuevas Subestaciones de distribución construidas y habilitadas		5 subestaciones	658 days	Tue 11/12/19	Thu 5/19/22	\$31,909,571.45								
3	1.1.1	Adquisición de terreno para Subestación Engombe Managuayabo			61 days	Mon 8/17/20	Mon 11/9/20	\$1,884,900.00 BI		CD	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-BI-CD-001	CDEE-EDESUR			
4	1.1.1.1	Gestión adquisición	4155-60 days		60 days	Mon 8/17/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
5	1.1.1.1	Pago	4		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,884,900.00								
6	1.1.2	Adquisición de terreno para Subestación Las Charcas			61 days	Mon 8/17/20	Mon 11/9/20	\$83,325.00 BI		CD	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-BI-CD-003	CDEE-EDESUR			
7	1.1.2.1	Gestión adquisición	4155-60 days		60 days	Mon 8/17/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
8	1.1.2.1	Pago	7		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$83,325.00								
9	1.1.3	Adquisición de terreno para Subestación Los Alcarrizos			61 days	Mon 8/17/20	Mon 11/9/20	\$538,800.00 BI		CD	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-BI-CD-004	CDEE-EDESUR			
10	1.1.3.1	Gestión adquisición	4155-60 days		60 days	Mon 8/17/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
11	1.1.3.1	Pago	10		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$538,800.00								
12	1.1.4	Adquisición de terreno para Subestación Piedra Blanca			61 days	Mon 8/17/20	Mon 11/9/20	\$538,800.00 BI		CD	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-BI-CD-005	CDEE-EDESUR			
13	1.1.4.1	Gestión adquisición	4155-60 days		60 days	Mon 8/17/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
14	1.1.4.1	Pago	13		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$538,800.00								
15	1.1.5	Adquisición de terreno para Subestación Fundación			61 days	Mon 8/17/20	Mon 11/9/20	\$17,500.00 BI		CD	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-BI-CD-002	CDEE-EDESUR			
16	1.1.5.1	Gestión adquisición	4155-60 days		60 days	Mon 8/17/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
17	1.1.5.1	Pago	16		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$17,500.00								
18	1.1.6	Construcción, Suministro e instalación y obras civiles de nuevas subestaciones y Adecuación Subestaciones existentes.			658 days	Tue 11/12/19	Thu 5/19/22	\$28,846,246.45 OB		LPI	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-OB-LPI-001	CDEE-EDESUR			
19	1.1.6.1	Proceso Licitación			259 days	Tue 11/12/19	Fri 11/6/20	\$0.00								
20	1.1.6.1.1	Preparación de Especificación	366FF		75 days	Tue 11/12/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
21	1.1.6.1.1	Preparación de Documento De Licitación	20		14 days	Tue 2/25/20	Fri 3/13/20	\$0.00								
22	1.1.6.1.1	Solicitud de no objeción al DDL y llamado a	21		1 day	Mon 3/16/20	Mon 3/16/20	\$0.00								
23	1.1.6.1.1	No objeción al DDL y llamado	22		10 days	Tue 3/17/20	Mon 3/30/20	\$0.00								
24	1.1.6.1.1	Publicación del llamado a licitación UNDB-Periódico	23		3 days	Tue 3/31/20	Thu 4/2/20	\$0.00								
25	1.1.6.1.1	Preparación de aclaraciones y/o	24		38 days	Fri 4/3/20	Tue 5/26/20	\$0.00								
26	1.1.6.1.1	Solicitud de no objeción a las enmiendas del DDL	25		1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	\$0.00								
27	1.1.6.1.1	No objeción a las enmiendas	26		5 days	Thu 5/28/20	Wed 6/3/20	\$0.00								
28	1.1.6.1.1	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los	27		1 day	Thu 6/4/20	Thu 6/4/20	\$0.00								
29	1.1.6.1.1	Plazo para la preparación	28		15 days	Fri 6/5/20	Thu 6/25/20	\$0.00								
30	1.1.6.1.1	Evaluación de ofertas	29		44 days	Fri 6/26/20	Wed 8/26/20	\$0.00								
31	1.1.6.1.1	Solicitud de no objeción al informe de evaluación	30		2 days	Thu 8/27/20	Fri 8/28/20	\$0.00								
32	1.1.6.1.1	No objeción al informe de evaluación de ofertas	31		10 days	Mon 8/31/20	Fri 9/11/20	\$0.00								
33	1.1.6.1.1	Adjudicación del Contrato	32		5 days	Mon 9/14/20	Fri 9/18/20	\$0.00								
34	1.1.6.1.1	Publicación de la adjudicación	33		5 days	Mon 9/21/20	Fri 9/25/20	\$0.00								
35	1.1.6.1.1	Excepcional Negociación de Contrato	34		5 days	Mon 9/28/20	Fri 10/2/20	\$0.00								
36	1.1.6.1.1	No objeción al Contrato Negociado	35		5 days	Mon 10/5/20	Fri 10/9/20	\$0.00								
37	1.1.6.1.1	Suscripción del Contrato	36		20 days	Mon 10/12/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
38	1.1.6.2	Proceso Ejecución Contractual			399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$28,846,246.45								
39	1.1.6.2.1	Subestación Engombe - Managuayabo	1 SE		399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$6,097,329.29								
40	1.1.6.2.1.1	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,219,465.86								
41	1.1.6.2.1.1.1	Pago (20%)	37		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,219,465.86								
42	1.1.6.2.1.1.2	Entrega de Bienes y Construcción de obras			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								

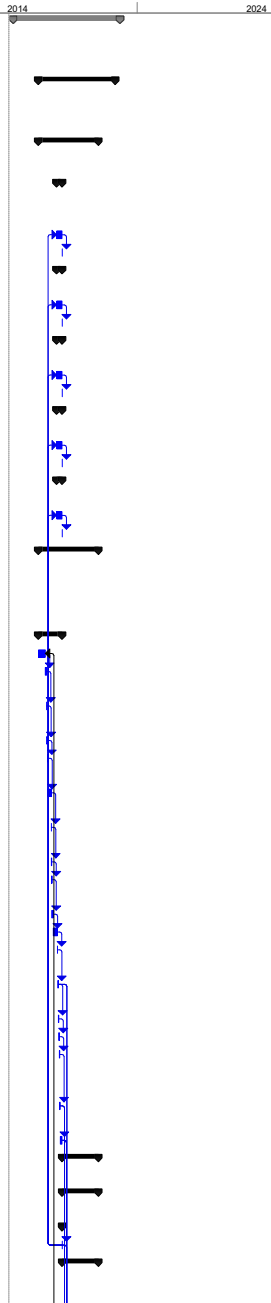


ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
43	1.1.6.	Avance Ejecución Añ41			177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
44	1.1.6.	Avance Ejecución Añ43			220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
45	1.1.6.	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$4,877,863.43								
46	1.1.6.	Pago 1	43		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$2,743,798.18								
47	1.1.6.	Pago 2	44		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$2,134,065.25								
48	1.1.6.	Subestación Las Charcas		1 SE	399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$3,818,429.29								
49	1.1.6.	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$763,685.86								
50	1.1.6.	Pago (20%)	37		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$763,685.86								
51	1.1.6.	Construcción			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								
52	1.1.6.	Avance Ejecución Af50			177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
53	1.1.6.	Avance Ejecución Af52			220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
54	1.1.6.	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$3,054,743.43								
55	1.1.6.	Pago 1	52		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$1,718,293.18								
56	1.1.6.	Pago 2	53		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$1,336,450.25								
57	1.1.6.	Subestación Los Alcarrizos		1 SE	399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$7,443,429.29								
58	1.1.6.	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,488,685.86								
59	1.1.6.	Pago (20%)	37		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,488,685.86								
60	1.1.6.	Construcción			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								
61	1.1.6.	Avance Ejecución Ai59			177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
62	1.1.6.	Avance Ejecución Ai61			220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
63	1.1.6.	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$5,954,743.43								
64	1.1.6.	Pago 1	61		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$3,349,543.18								
65	1.1.6.	Pago 2	62		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$2,605,200.25								
66	1.1.6.	Subestación Piedra Blanca		1 SE	399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$7,443,429.29								
67	1.1.6.	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,488,685.86								
68	1.1.6.	Pago (20%)	37		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$1,488,685.86								
69	1.1.6.	Construcción			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								
70	1.1.6.	Avance Ejecución A68			177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
71	1.1.6.	Avance Ejecución A70			220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
72	1.1.6.	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$5,954,743.43								
73	1.1.6.	Pago 1	70		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$3,349,543.18								
74	1.1.6.	Pago 2	71		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$2,605,200.25								
75	1.1.6.	Subestación Fundación		1 SE	399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$4,043,629.29								
76	1.1.6.	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$808,725.86								
77	1.1.6.	Pago (20%)	37		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$808,725.86								
78	1.1.6.	Construcción			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								
79	1.1.6.	Avance Ejecución A77			177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
80	1.1.6.	Avance Ejecución A79			220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
81	1.1.6.	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$3,234,903.43								
82	1.1.6.	Pago 1	79		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$1,819,633.18								
83	1.1.6.	Pago 2	80		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$1,415,270.25								
84	1.2	Red de distribución habilitada (MT y BT)		TBC km (MT)	698 days	Mon 6/1/20	Wed 2/1/23	\$31,535,714.29								
85	1.2.1	Rehabilitación y expansión de Redes Asociadas (Subestaciones nuevas y Existentes); Suministro e Instalación de Interruptores telegestionados y macromedidos.			698 days	Mon 6/1/20	Wed 2/1/23	\$31,535,714.29	OB	LPI	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-OB-LPI-002	CDEEE-EDESUR			
86	1.2.1.	Proceso Licitación			259 days	Mon 6/1/20	Thu 5/27/21	\$0.00								
87	1.2.1.	Preparación de Especifica	366FF,32FF		75 days	Mon 6/1/20	Fri 9/11/20	\$0.00								
88	1.2.1.	Preparación de Documento De Licitación	87		14 days	Mon 9/14/20	Thu 10/1/20	\$0.00								
89	1.2.1.	Solicitud de no objeción al DDL y llamado a	88		1 day	Fri 10/2/20	Fri 10/2/20	\$0.00								
90	1.2.1.	No objeción al DDL y llama	89		10 days	Mon 10/5/20	Fri 10/16/20	\$0.00								
91	1.2.1.	Publicación del llamado a licitación UNDB-Periódico	90		3 days	Mon 10/19/20	Wed 10/21/20	\$0.00								
92	1.2.1.	Preparación de aclaraciones y/o	91		38 days	Thu 10/22/20	Mon 12/14/20	\$0.00								
93	1.2.1.	Solicitud de no objeción a las enmiendas del DDL	92		1 day	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$0.00								
94	1.2.1.	No objeción a las enmienc	93		5 days	Wed 12/16/20	Tue 12/22/20	\$0.00								
95	1.2.1.	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los	94		1 day	Wed 12/23/20	Wed 12/23/20	\$0.00								
96	1.2.1.	Plazo para la preparación	95		15 days	Thu 12/24/20	Wed 1/13/21	\$0.00								
97	1.2.1.	Evaluación de ofertas	96		44 days	Thu 1/14/21	Tue 3/16/21	\$0.00								



ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
98	1.2.1	Solicitud de no objeción al informe de evaluación	97		2 days	Wed 3/17/21	Thu 3/18/21	\$0.00								
99	1.2.1	No objeción al informe de evaluación de ofertas	98		10 days	Fri 3/19/21	Thu 4/1/21	\$0.00								
100	1.2.1	Adjudicación del Contrato	99		5 days	Fri 4/2/21	Thu 4/8/21	\$0.00								
101	1.2.1	Publicación de la adjudicación	100		5 days	Fri 4/9/21	Thu 4/15/21	\$0.00								
102	1.2.1	Excepcional Negociación de Contrato	101		5 days	Fri 4/16/21	Thu 4/22/21	\$0.00								
103	1.2.1	No objeción al Contrato Negociado	102		5 days	Fri 4/23/21	Thu 4/29/21	\$0.00								
104	1.2.1	Suscripción del Contrato	103		20 days	Fri 4/30/21	Thu 5/27/21	\$0.00								
105	1.2.1	Proceso Ejecución Contractu			439 days	Fri 5/28/21	Wed 2/1/23	\$31,535,714.29								
106	1.2.1	Anticipo			1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$6,307,142.86								
107	1.2.1	Pago (20%)	104		1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$6,307,142.86								
108	1.2.1	Construcción			397 days	Mon 5/31/21	Tue 12/6/22	\$0.00								
109	1.2.1	Avance Ejecución Año	107		177 days	Mon 5/31/21	Tue 2/1/22	\$0.00								
110	1.2.1	Avance Ejecución Año	109		220 days	Wed 2/2/22	Tue 12/6/22	\$0.00								
111	1.2.1	Pagos			261 days	Wed 2/2/22	Wed 2/1/23	\$25,228,571.43								
112	1.2.1	Pago 1	109		1 day	Wed 2/2/22	Wed 2/2/22	\$11,352,857.14								
113	1.2.1	Pago 2	110		1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22	\$11,920,500.00								
114	1.2.1	Pago 3 (5%)	113FF+40 da		1 day	Wed 2/1/23	Wed 2/1/23	\$1,955,214.29								
115	1.3	Fin componente 1	83,113,114,143		0 days	Wed 2/1/23	Wed 2/1/23	\$0.00								
116	2	Componente 2: Rehabilitación y adecuación subestaciones existentes y redes asociadas			603 days	Mon 10/12/20	Wed 2/1/23	\$86,614,285.71								
117	2.1	Subestaciones de distribución renovadas		9 Subestaciones	419 days	Mon 10/12/20	Thu 5/19/22	\$28,550,000.00								
118	2.1.1	Construcción, Suministro e Instalación y obras civiles de nuevas subestaciones y Adecuación Subestaciones existentes.			419 days	Mon 10/12/20	Thu 5/19/22	\$28,550,000.00	OB		LPI	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-OB-LPI-001	CDEE-EDESUR		
119	2.1.1	Proceso Licitación			20 days	Mon 10/12/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
120	2.1.1	Suscripción del Contrato	36		20 days	Mon 10/12/20	Fri 11/6/20	\$0.00								
121	2.1.1	Proceso Ejecución Contractu		9 SE	399 days	Mon 11/9/20	Thu 5/19/22	\$28,550,000.00								
122	2.1.1	Anticipo			1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$5,710,000.00								
123	2.1.1	Pago (20%)	120		1 day	Mon 11/9/20	Mon 11/9/20	\$5,710,000.00								
124	2.1.1	Construcción			397 days	Tue 11/10/20	Wed 5/18/22	\$0.00								
125	2.1.1	Avance Ejecución Año	123		177 days	Tue 11/10/20	Wed 7/14/21	\$0.00								
126	2.1.1	Avance Ejecución Año	125		220 days	Thu 7/15/21	Wed 5/18/22	\$0.00								
127	2.1.1	Pagos			221 days	Thu 7/15/21	Thu 5/19/22	\$22,840,000.00								
128	2.1.1	Pago 1	125		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$12,847,500.00								
129	2.1.1	Pago 2	126		1 day	Thu 5/19/22	Thu 5/19/22	\$9,992,500.00								
130	2.2	Red de distribución rehabilitada (MT y BT)		TBC km (MT)	459 days	Fri 4/30/21	Wed 2/1/23	\$56,764,285.71								
131	2.2.1	Rehabilitación y expansión de Redes Asociadas (Subestaciones nuevas y Existentes); Suministro e Instalación de Interruptores telegestionados y macromedidos.			459 days	Fri 4/30/21	Wed 2/1/23	\$56,764,285.71	OB		LPI	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-OB-LPI-002	CDEEE-EDESUR		
132	2.2.1	Proceso Licitación			20 days	Fri 4/30/21	Thu 5/27/21	\$0.00								
133	2.2.1	Suscripción del Contrato	103		20 days	Fri 4/30/21	Thu 5/27/21	\$0.00								
134	2.2.1	Proceso Ejecución Contractu			439 days	Fri 5/28/21	Wed 2/1/23	\$56,764,285.71								
135	2.2.1	Anticipo			1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$11,352,857.14								
136	2.2.1	Pago (20%)	133		1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$11,352,857.14								
137	2.2.1	Construcción			397 days	Mon 5/31/21	Tue 12/6/22	\$0.00								
138	2.2.1	Avance Ejecución Año	136		177 days	Mon 5/31/21	Tue 2/1/22	\$0.00								
139	2.2.1	Avance Ejecución Año	138		220 days	Wed 2/2/22	Tue 12/6/22	\$0.00								
140	2.2.1	Pagos			261 days	Wed 2/2/22	Wed 2/1/23	\$45,411,428.57								
141	2.2.1	Pago 1	138		1 day	Wed 2/2/22	Wed 2/2/22	\$20,435,142.86								
142	2.2.1	Pago 2	139		1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22	\$22,705,714.28								
143	2.2.1	Pago 3 (5%)	113FF+40 da		1 day	Wed 2/1/23	Wed 2/1/23	\$2,270,571.43								
144	2.3	Interruptores telegestionados (reclosers) y macromedición MT Instalados		70 Interruptores	459 days	Fri 4/30/21	Wed 2/1/23	\$1,900,000.00								



ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
145	2.3.1	Rehabilitación y expansión de Redes Asociadas (Subestaciones nuevas y Existentes); Suministro e instalación de Interruptores telegestionados y macromedidos.			459 days	Fri 4/30/21	Wed 2/1/23	\$1,300,000.00	OB	LPI	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-OB-LPI-002	CDEEE-EDESUR			
146	2.3.1	Proceso Licitación			20 days	Fri 4/30/21	Thu 5/27/21	\$0.00								
147	2.3.1	Suscripción del Contrato	103		20 days	Fri 4/30/21	Thu 5/27/21	\$0.00								
148	2.3.1	Proceso Instalación			439 days	Fri 5/28/21	Wed 2/1/23	\$1,300,000.00								
149	2.3.1	Anticipo			1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$260,000.00								
150	2.3.1	Pago	147		1 day	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$260,000.00								
151	2.3.1	Montaje			397 days	Mon 5/31/21	Tue 12/6/22	\$0.00								
152	2.3.1	Avance Ejecución Año	150		177 days	Mon 5/31/21	Tue 2/1/22	\$0.00								
153	2.3.1	Avance Ejecución Año	152		220 days	Wed 2/2/22	Tue 12/6/22	\$0.00								
154	2.3.1	Pagos			261 days	Wed 2/2/22	Wed 2/1/23	\$1,040,000.00								
155	2.3.1	Pago 1	152		1 day	Wed 2/2/22	Wed 2/2/22	\$195,000.00								
156	2.3.1	Pago 2	153		1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22	\$793,000.00								
157	2.3.1	Pago 3 (5%)	156FF+40 da		1 day	Wed 2/1/23	Wed 2/1/23	\$52,000.00								
158	2.4	Fin componente 2	156,142,129,15		0 days	Wed 2/1/23	Wed 2/1/23	\$0.00								
159	3	Administración y Control del Proyecto			868 days	Tue 12/17/19	Thu 4/13/23	\$4,940,428.55								
160	3.1	Administración del Proyecto			799 days	Mon 2/24/20	Thu 3/16/23	\$812,428.55								
161	3.1.1	Consultores apoyo a UEP			799 days	Mon 2/24/20	Thu 3/16/23	\$796,428.55	CI	CD	EX ANTE					
162	3.1.1	Pago	366FF		1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20	\$199,107.13								
163	3.1.1	Pago	162FF+266 d		1 day	Tue 3/2/21	Tue 3/2/21	\$199,107.13								
164	3.1.1	Pago	163FF+266 d		1 day	Wed 3/9/22	Wed 3/9/22	\$199,107.13								
165	3.1.1	Pago	164FF+266 d		1 day	Thu 3/16/23	Thu 3/16/23	\$199,107.16								
166	3.1.2	Adquisición de laptops para equipo del proyecto			93 days	Mon 8/17/20	Wed 12/23/20	\$16,000.00	BI	CP	EX POST	CDEEE-EDESUR-CP-001				
167	3.1.2	Proceso Precontractual			62 days	Mon 8/17/20	Tue 11/10/20	\$0.00								
168	3.1.2	Preparación de Especificaciones Técnicas	366FF,32FF		20 days	Mon 8/17/20	Fri 9/11/20	\$0.00								
169	3.1.2	Preparación de solicitud de cotización	168		5 days	Mon 9/14/20	Fri 9/18/20	\$0.00								
170	3.1.2	Remisión de la solicitud de cotización a potenciales oferentes	169		3 days	Mon 9/21/20	Wed 9/23/20	\$0.00								
171	3.1.2	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas a la solicitud de cotización	170		5 days	Thu 9/24/20	Wed 9/30/20	\$0.00								
172	3.1.2	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes	171		1 day	Thu 10/1/20	Thu 10/1/20	\$0.00								
173	3.1.2	Plazo para la preparación de cotizaciones	172		10 days	Fri 10/2/20	Thu 10/15/20	\$0.00								
174	3.1.2	Evaluación de ofertas	173		5 days	Fri 10/16/20	Thu 10/22/20	\$0.00								
175	3.1.2	Adjudicación del Contrato u orden de compra	174		3 days	Fri 10/23/20	Tue 10/27/20	\$0.00								
176	3.1.2	Publicación de la adjudicación del contrato u orden de compra	175		5 days	Wed 10/28/20	Tue 11/3/20	\$0.00								
177	3.1.2	Suscripción del Contrato u orden de compra	176		5 days	Wed 11/4/20	Tue 11/10/20	\$0.00								
178	3.1.2	Proceso Contractual			30 days	Wed 11/11/20	Tue 12/22/20	\$0.00								
179	3.1.2	Entrega de productos	177		30 days	Wed 11/11/20	Tue 12/22/20	\$0.00								
180	3.1.2	Pagos			1 day	Wed 12/23/20	Wed 12/23/20	\$16,000.00								
181	3.1.2	Pago	179		1 day	Wed 12/23/20	Wed 12/23/20	\$16,000.00								
182	3.2	Control del Proyecto			868 days	Tue 12/17/19	Thu 4/13/23	\$4,128,000.00								
183	3.2.1	Fiscalización Obras de Infraestructura			703 days	Tue 2/25/20	Thu 11/3/22	\$3,000,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-CF-001				
184	3.2.1	Proceso Precontractual			182 days	Tue 2/25/20	Wed 11/4/20	\$0.00								
185	3.2.1	Preparación de términos	366		20 days	Tue 2/25/20	Mon 3/23/20	\$0.00								




DR-L1128 - PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE REDES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN DISTRIBUCIÓN
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
186	3.2.1	Estimación de costos y pr	185		5 days	Tue 3/24/20	Mon 3/30/20	\$0.00								
187	3.2.1	Solicitud de no objeción a	186		1 day	Tue 3/31/20	Tue 3/31/20	\$0.00								
188	3.2.1	No objeción a los TdRs	187		5 days	Wed 4/1/20	Tue 4/7/20	\$0.00								
189	3.2.1	Publicidad del anuncio para solicitar expresiones	188		3 days	Wed 4/8/20	Fri 4/10/20	\$0.00								
190	3.2.1	Presentación de expresiones de interés	189		14 days	Mon 4/13/20	Thu 4/30/20	\$0.00								
191	3.2.1	Análisis de expresiones de interés y	190		5 days	Fri 5/1/20	Thu 5/7/20	\$0.00								
192	3.2.1	Preparación de solicitud de propuestas	191		15 days	Fri 5/8/20	Thu 5/28/20	\$0.00								
193	3.2.1	Solicitud de no objeción a la solicitud de propuestas	192		2 days	Fri 5/29/20	Mon 6/1/20	\$0.00								
194	3.2.1	No objeción a la solicitud de propuestas incluida la	193		10 days	Tue 6/2/20	Mon 6/15/20	\$0.00								
195	3.2.1	Remisión de la solicitud de propuestas a la lista	194		2 days	Tue 6/16/20	Wed 6/17/20	\$0.00								
196	3.2.1	Preparación de aclaraciones y/o	195		5 days	Thu 6/18/20	Wed 6/24/20	\$0.00								
197	3.2.1	Solicitud de no objeción a las enmiendas	196		2 days	Thu 6/25/20	Fri 6/26/20	\$0.00								
198	3.2.1	No objeción a las enmiend	197		5 days	Mon 6/29/20	Fri 7/3/20	\$0.00								
199	3.2.1	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a la lista	198		3 days	Mon 7/6/20	Wed 7/8/20	\$0.00								
200	3.2.1	Plazo para recepción de p	199		20 days	Thu 7/9/20	Wed 8/5/20	\$0.00								
201	3.2.1	Evaluación de propuestas	200		10 days	Thu 8/6/20	Wed 8/19/20	\$0.00								
202	3.2.1	Solicitud de no objeción al informe de propuestas	201		2 days	Thu 8/20/20	Fri 8/21/20	\$0.00								
203	3.2.1	No objeción al informe de evaluación de	202		5 days	Mon 8/24/20	Fri 8/28/20	\$0.00								
204	3.2.1	Notificación de puntajes t	203		3 days	Mon 8/31/20	Wed 9/2/20	\$0.00								
205	3.2.1	Apertura de propuestas d	204		1 day	Thu 9/3/20	Thu 9/3/20	\$0.00								
206	3.2.1	Evaluación del costo	205		5 days	Fri 9/4/20	Thu 9/10/20	\$0.00								
207	3.2.1	Evaluación combinada de la calidad y el costo	206		5 days	Fri 9/11/20	Thu 9/17/20	\$0.00								
208	3.2.1	Remisión al Banco para información de linforme	207		1 day	Fri 9/18/20	Fri 9/18/20	\$0.00								
209	3.2.1	Negociación del Contrato	208		1 day	Mon 9/21/20	Mon 9/21/20	\$0.00								
210	3.2.1	Solicitud de no objeción al contrato negociado	209		1 day	Tue 9/22/20	Tue 9/22/20	\$0.00								
211	3.2.1	No objeción al contrato n	210		5 days	Wed 9/23/20	Tue 9/29/20	\$0.00								
212	3.2.1	Adjudicación del Contrato	211		5 days	Wed 9/30/20	Tue 10/6/20	\$0.00								
213	3.2.1	Publicación de la adjudicación del contrato	212		1 day	Wed 10/7/20	Wed 10/7/20	\$0.00								
214	3.2.1	Suscripción del Contrato	213		20 days	Thu 10/8/20	Wed 11/4/20	\$0.00								
215	3.2.1	Proceso Contractual			518 days	Tue 11/10/20	Thu 11/3/22	\$0.00								
216	3.2.1	Ejecución	41,214		518 days	Tue 11/10/20	Thu 11/3/22	\$0.00								
217	3.2.1	Pagos			431 days	Tue 11/10/20	Tue 7/5/22	\$3,000,000.00								
218	3.2.1	Pago	216SS		1 day	Tue 11/10/20	Tue 11/10/20	\$600,000.00								
219	3.2.1	Pago	218SS+180 d		1 day	Tue 7/20/21	Tue 7/20/21	\$1,200,000.00								
220	3.2.1	Pago	219SS+250 d		1 day	Tue 7/5/22	Tue 7/5/22	\$1,200,000.00								
221	3.2.2	Auditoría Financiera			827 days	Tue 2/11/20	Wed 4/12/23	\$75,000.00 FC		SBCC	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-CF-002				
222	3.2.2	Proceso Precontractual			167 days	Tue 2/11/20	Wed 9/30/20	\$0.00								
223	3.2.2	Preparación de términos	366FF		10 days	Tue 2/11/20	Mon 2/24/20	\$0.00								
224	3.2.2	Estimación de costos y pr	223		5 days	Tue 2/25/20	Mon 3/2/20	\$0.00								
225	3.2.2	Solicitud de no objeción a	224		1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20	\$0.00								
226	3.2.2	No objeción a los TdRs	225		5 days	Wed 3/4/20	Tue 3/10/20	\$0.00								
227	3.2.2	Publicidad del anuncio para solicitar expresiones	226		3 days	Wed 3/11/20	Fri 3/13/20	\$0.00								
228	3.2.2	Presentación de expresiones de interés	227		14 days	Mon 3/16/20	Thu 4/2/20	\$0.00								
229	3.2.2	Análisis de expresiones de interés y	228		5 days	Fri 4/3/20	Thu 4/9/20	\$0.00								
230	3.2.2	Preparación de solicitud de propuestas	229		15 days	Fri 4/10/20	Thu 4/30/20	\$0.00								
231	3.2.2	Solicitud de no objeción a la solicitud de propuestas	230		2 days	Fri 5/1/20	Mon 5/4/20	\$0.00								
232	3.2.2	No objeción a la solicitud de propuestas incluida la	231		10 days	Tue 5/5/20	Mon 5/18/20	\$0.00								
233	3.2.2	Remisión de la solicitud de propuestas a la lista	232		2 days	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	\$0.00								
234	3.2.2	Preparación de aclaraciones y/o	233		5 days	Thu 5/21/20	Wed 5/27/20	\$0.00								
235	3.2.2	Solicitud de no objeción a las enmiendas	234		2 days	Thu 5/28/20	Fri 5/29/20	\$0.00								

DR-L1128 - PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE REDES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN DISTRIBUCIÓN
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
236	3.2.2	No objeción a las emienc	235		5 days	Mon 6/1/20	Fri 6/5/20	\$0.00								
237	3.2.2	Remisión de aclaraciones y/o emiencas a la lista	236		3 days	Mon 6/8/20	Wed 6/10/20	\$0.00								
238	3.2.2	Plazo para recepción de p	237		15 days	Thu 6/11/20	Wed 7/1/20	\$0.00								
239	3.2.2	Evaluación de propuestas	238		10 days	Thu 7/2/20	Wed 7/15/20	\$0.00								
240	3.2.2	Solicitud de no objeción al informe de propuestas	239		2 days	Thu 7/16/20	Fri 7/17/20	\$0.00								
241	3.2.2	No objeción al informe de evaluación de	240		5 days	Mon 7/20/20	Fri 7/24/20	\$0.00								
242	3.2.2	Notificación de puntajes t	241		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00								
243	3.2.2	Apertura de propuestas d	242		1 day	Thu 7/30/20	Thu 7/30/20	\$0.00								
244	3.2.2	Evaluación del costo	243		5 days	Fri 7/31/20	Thu 8/6/20	\$0.00								
245	3.2.2	Evaluación combinada de la calidad y el costo	244		5 days	Fri 8/7/20	Thu 8/13/20	\$0.00								
246	3.2.2	Remisión al Banco para información de informe	245		1 day	Fri 8/14/20	Fri 8/14/20	\$0.00								
247	3.2.2	Negociación del Contrato	246		1 day	Mon 8/17/20	Mon 8/17/20	\$0.00								
248	3.2.2	Solicitud de no objeción al contrato negociado	247		1 day	Tue 8/18/20	Tue 8/18/20	\$0.00								
249	3.2.2	No objeción al contrato n	248		5 days	Wed 8/19/20	Tue 8/25/20	\$0.00								
250	3.2.2	Adjudicación del Contrato	249		5 days	Wed 8/26/20	Tue 9/1/20	\$0.00								
251	3.2.2	Publicación de la adjudicación del contrato	250		1 day	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$0.00								
252	3.2.2	Suscripción del Contrato	251		20 days	Thu 9/3/20	Wed 9/30/20	\$0.00								
253	3.2.2	Proceso Contractual			660 days	Thu 10/1/20	Wed 4/12/23	\$0.00								
254	3.2.2	Ejecución	252		660 days	Thu 10/1/20	Wed 4/12/23	\$0.00								
255	3.2.2	Pagos			543 days	Fri 3/12/21	Tue 4/11/23	\$75,000.00								
256	3.2.2	Pago	254SS+116 d		1 day	Fri 3/12/21	Fri 3/12/21	\$25,000.00								
257	3.2.2	Pago	256FS+260 d		1 day	Mon 3/14/22	Mon 3/14/22	\$25,000.00								
258	3.2.2	Pago	257FS+280 d		1 day	Tue 4/11/23	Tue 4/11/23	\$25,000.00								
259	3.2.3	Supervisión ejecución obras (5 consultores)			753 days	Tue 12/17/19	Thu 11/3/22	\$540,000.00 CI	3CVs	EX ANTE		CDEE-EDSUR-CI-3CVs-001				
260	3.2.3	Proceso Precontractual			117 days	Tue 12/17/19	Wed 5/27/20	\$0.00								
261	3.2.3	Preparación de términos	366FF		50 days	Tue 12/17/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
262	3.2.3	Estimación de costos y pr	261		5 days	Tue 2/25/20	Mon 3/2/20	\$0.00								
263	3.2.3	Solicitud de no objeción a	262		1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20	\$0.00								
264	3.2.3	No objeción a los TdRs	263		5 days	Wed 3/4/20	Tue 3/10/20	\$0.00								
265	3.2.3	Invitación pública a participar	264		3 days	Wed 3/11/20	Fri 3/13/20	\$0.00								
266	3.2.3	Presentación de expresiones de interés y	265		14 days	Mon 3/16/20	Thu 4/2/20	\$0.00								
267	3.2.3	Evaluación de candidatos	266		5 days	Fri 4/3/20	Thu 4/9/20	\$0.00								
268	3.2.3	Solicitud de no objeción a la propuesta de adjudicación	267		2 days	Fri 4/10/20	Mon 4/13/20	\$0.00								
269	3.2.3	No objeción a la propuesta de	268		5 days	Tue 4/14/20	Mon 4/20/20	\$0.00								
270	3.2.3	Adjudicación del Contrato	269		5 days	Tue 4/21/20	Mon 4/27/20	\$0.00								
271	3.2.3	Notificación de resultados	270		2 days	Tue 4/28/20	Wed 4/29/20	\$0.00								
272	3.2.3	Suscripción del Contrato	271		20 days	Thu 4/30/20	Wed 5/27/20	\$0.00								
273	3.2.3	Proceso Contractual			518 days	Tue 11/10/20	Thu 11/3/22	\$0.00								
274	3.2.3	Ejecución	272,41		518 days	Tue 11/10/20	Thu 11/3/22	\$0.00								
275	3.2.3	Pagos			152 days	Tue 10/12/21	Wed 5/11/22	\$540,000.00								
276	3.2.3	Pago	274SS+240 d		1 day	Tue 10/12/21	Tue 10/12/21	\$270,000.00								
277	3.2.3	Pago	276FS+150 d		1 day	Wed 5/11/22	Wed 5/11/22	\$270,000.00								
278	3.2.4	Evaluación medio término			118 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$25,000.00 CI	3CVs	EX ANTE		CDEE-EDSUR-CI-3CVs-002				
279	3.2.4	Proceso Precontractual			87 days	Tue 4/20/21	Wed 8/18/21	\$0.00								
280	3.2.4	Preparación de términos	366FS+300 d		20 days	Tue 4/20/21	Mon 5/17/21	\$0.00								
281	3.2.4	Estimación de costos y pr	280		5 days	Tue 5/18/21	Mon 5/24/21	\$0.00								
282	3.2.4	Solicitud de no objeción a	281		1 day	Tue 5/25/21	Tue 5/25/21	\$0.00								
283	3.2.4	No objeción a los TdRs	282		5 days	Wed 5/26/21	Tue 6/1/21	\$0.00								
284	3.2.4	Invitación a participar e invitación pública a	283		3 days	Wed 6/2/21	Fri 6/4/21	\$0.00								
285	3.2.4	Presentación de expresiones de interés y	284		14 days	Mon 6/7/21	Thu 6/24/21	\$0.00								
286	3.2.4	Evaluación de candidatos	285		5 days	Fri 6/25/21	Thu 7/1/21	\$0.00								
287	3.2.4	Solicitud de no objeción a la propueta de	286		2 days	Fri 7/2/21	Mon 7/5/21	\$0.00								
288	3.2.4	No objeción a la propuesta de	287		5 days	Tue 7/6/21	Mon 7/12/21	\$0.00								
289	3.2.4	Adjudicación del Contrato	288		5 days	Tue 7/13/21	Mon 7/19/21	\$0.00								
290	3.2.4	Notificación de resultados	289		2 days	Tue 7/20/21	Wed 7/21/21	\$0.00								
291	3.2.4	Suscripción del Contrato	290		20 days	Thu 7/22/21	Wed 8/18/21	\$0.00								
292	3.2.4	Proceso Contractual			30 days	Thu 8/19/21	Wed 9/29/21	\$0.00								

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
293	3.2.4.	Ejecución	291		30 days	Thu 8/19/21	Wed 9/29/21	\$0.00								
294	3.2.4.	Pagos			1 day	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$25,000.00								
295	3.2.4.	Pago	293		1 day	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$25,000.00								
296	3.2.5.	Evaluación final			18 days	Tue 11/1/22	Thu 4/13/23	\$50,000.00	CI	3CVs	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-CI-3CVs-003				
297	3.2.5.	Proceso Precontractual			87 days	Tue 11/1/22	Wed 3/1/23	\$0.00								
298	3.2.5.	Preparación de términos	366FS+700 d		20 days	Tue 11/1/22	Mon 11/28/22	\$0.00								
299	3.2.5.	Estimación de costos y prr	298		5 days	Tue 11/29/22	Mon 12/5/22	\$0.00								
300	3.2.5.	Solicitud de no objeción a	299		1 day	Tue 12/6/22	Tue 12/6/22	\$0.00								
301	3.2.5.	No objeción a los TDRs	300		5 days	Wed 12/7/22	Tue 12/13/22	\$0.00								
302	3.2.5.	Invitación a participar e invitación pública a	301		3 days	Wed 12/14/22	Fri 12/16/22	\$0.00								
303	3.2.5.	Presentación de expresiones de interés y	302		14 days	Mon 12/19/22	Thu 1/5/23	\$0.00								
304	3.2.5.	Evaluación de candidatos	303		5 days	Fri 1/6/23	Thu 1/12/23	\$0.00								
305	3.2.5.	Solicitud de no objeción a la propuesta de	304		2 days	Fri 1/13/23	Mon 1/16/23	\$0.00								
306	3.2.5.	No objeción a la propuesta de	305		5 days	Tue 1/17/23	Mon 1/23/23	\$0.00								
307	3.2.5.	Adjudicación del Contrato	306		5 days	Tue 1/24/23	Mon 1/30/23	\$0.00								
308	3.2.5.	Notificación de resultados	307		2 days	Tue 1/31/23	Wed 2/1/23	\$0.00								
309	3.2.5.	Suscripción del Contrato	308		20 days	Thu 2/2/23	Wed 3/1/23	\$0.00								
310	3.2.5.	Proceso Contractual			30 days	Thu 3/2/23	Wed 4/12/23	\$0.00								
311	3.2.5.	Ejecución	309		30 days	Thu 3/2/23	Wed 4/12/23	\$0.00								
312	3.2.5.	Pagos			1 day	Thu 4/13/23	Thu 4/13/23	\$50,000.00								
313	3.2.5.	Pago	311		1 day	Thu 4/13/23	Thu 4/13/23	\$50,000.00								
314	3.2.6.	Gastos operativos			603 days	Mon 2/24/20	Wed 6/15/22	\$150,000.00	GO							
315	3.2.6.	Pago	366FF		1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20	\$30,000.00								
316	3.2.6.	Pago	315FS+300 d		1 day	Tue 4/20/21	Tue 4/20/21	\$60,000.00								
317	3.2.6.	Pago	316FS+300 d		1 day	Wed 6/15/22	Wed 6/15/22	\$60,000.00								
318	3.2.7.	Adquisición de cámaras termográficas para equipo de supervisión			194 days	Tue 12/17/19	Fri 9/11/20	\$112,000.00	BI	LPN	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-LPN-002				
319	3.2.7.	Proceso Licitación			169 days	Tue 12/17/19	Fri 8/7/20	\$0.00								
320	3.2.7.	Preparación de Especificación	366FF		50 days	Tue 12/17/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
321	3.2.7.	Preparación de Documento De Licitación	320		14 days	Tue 2/25/20	Fri 3/13/20	\$0.00								
322	3.2.7.	Solicitud de no objeción al DDL y llamado a	321		1 day	Mon 3/16/20	Mon 3/16/20	\$0.00								
323	3.2.7.	No objeción al DDL y llam	322		10 days	Tue 3/17/20	Mon 3/30/20	\$0.00								
324	3.2.7.	Publicación del llamado a	323		3 days	Tue 3/31/20	Thu 4/2/20	\$0.00								
325	3.2.7.	Preparación de aclaraciones y/o	324		7 days	Fri 4/3/20	Mon 4/13/20	\$0.00								
326	3.2.7.	Solicitud de no objeción a las enmiendas del DDL	325		1 day	Tue 4/14/20	Tue 4/14/20	\$0.00								
327	3.2.7.	No objeción a las enmiend	326		5 days	Wed 4/15/20	Tue 4/21/20	\$0.00								
328	3.2.7.	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los	327		1 day	Wed 4/22/20	Wed 4/22/20	\$0.00								
329	3.2.7.	Plazo para la preparación	328		20 days	Thu 4/23/20	Wed 5/20/20	\$0.00								
330	3.2.7.	Evaluación de ofertas	329		22 days	Thu 5/21/20	Fri 6/19/20	\$0.00								
331	3.2.7.	Solicitud de no objeción al informe de evaluación	330		2 days	Mon 6/22/20	Tue 6/23/20	\$0.00								
332	3.2.7.	No objeción al informe de evaluación de ofertas	331		5 days	Wed 6/24/20	Tue 6/30/20	\$0.00								
333	3.2.7.	Adjudicación del Contrato	332		3 days	Wed 7/1/20	Fri 7/3/20	\$0.00								
334	3.2.7.	Publicación de la adjudica	333		5 days	Mon 7/6/20	Fri 7/10/20	\$0.00								
335	3.2.7.	Suscripción del Contrato	334		20 days	Mon 7/13/20	Fri 8/7/20	\$0.00								
336	3.2.7.	Proceso Ejecución Contractual			24 days	Mon 8/10/20	Thu 9/10/20	\$0.00								
337	3.2.7.	Entrega de Bienes	335		24 days	Mon 8/10/20	Thu 9/10/20	\$0.00								
338	3.2.7.	Pagos			1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$112,000.00								
339	3.2.7.	Pago	337		1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$112,000.00								
340	3.2.8.	Adquisición de 5 vehículos para supervisión obras			194 days	Tue 12/17/19	Fri 9/11/20	\$176,000.00	BI	LPN	EX ANTE	CDEEE-EDESUR-LPN-001				
341	3.2.8.	Proceso Licitación			169 days	Tue 12/17/19	Fri 8/7/20	\$0.00								
342	3.2.8.	Preparación de Especificación	366FF		50 days	Tue 12/17/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
343	3.2.8.	Preparación de Documento De Licitación	342		14 days	Tue 2/25/20	Fri 3/13/20	\$0.00								
344	3.2.8.	Solicitud de no objeción al DDL y llamado a	343		1 day	Mon 3/16/20	Mon 3/16/20	\$0.00								
345	3.2.8.	No objeción al DDL y llam	344		10 days	Tue 3/17/20	Mon 3/30/20	\$0.00								
346	3.2.8.	Publicación del llamado a	345		3 days	Tue 3/31/20	Thu 4/2/20	\$0.00								
347	3.2.8.	Preparación de aclaraciones y/o	346		7 days	Fri 4/3/20	Mon 4/13/20	\$0.00								
348	3.2.8.	Solicitud de no objeción a las enmiendas del DDL	347		1 day	Tue 4/14/20	Tue 4/14/20	\$0.00								

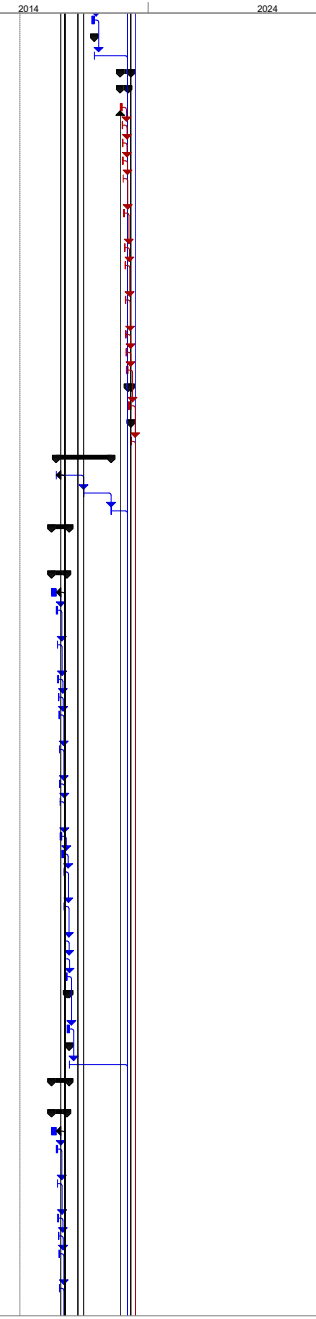

DR-L1128 - PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE REDES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN DISTRIBUCIÓN
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecessors	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente	1984 2004	2014	2024
349	3.2.8.	No objeción a las emienc	348		5 days	Wed 4/15/20	Tue 4/21/20	\$0.00								
350	3.2.8.	Remisión de aclaraciones y/o emiencias a los	349		1 day	Wed 4/22/20	Wed 4/22/20	\$0.00								
351	3.2.8.	Plazo para la preparación	350		20 days	Thu 4/23/20	Wed 5/20/20	\$0.00								
352	3.2.8.	Evaluación de ofertas	351		22 days	Thu 5/21/20	Fri 6/19/20	\$0.00								
353	3.2.8.	Solicitud de no objeción al informe de evaluación	352		2 days	Mon 6/22/20	Tue 6/23/20	\$0.00								
354	3.2.8.	No objeción al informe de evaluación de ofertas	353		5 days	Wed 6/24/20	Tue 6/30/20	\$0.00								
355	3.2.8.	Adjudicación del Contrato	354		3 days	Wed 7/1/20	Fri 7/3/20	\$0.00								
356	3.2.8.	Publicación de la adjudica	355		5 days	Mon 7/6/20	Fri 7/10/20	\$0.00								
357	3.2.8.	Suscripción del Contrato	356		20 days	Mon 7/13/20	Fri 8/7/20	\$0.00								
358	3.2.8.	Proceso Ejecución Contractu			24 days	Mon 8/10/20	Thu 9/10/20	\$0.00								
359	3.2.8.	Entrega de vehiculos	357		24 days	Mon 8/10/20	Thu 9/10/20	\$0.00		LPN						
360	3.2.8.	Pagos			1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$176,000.00								
361	3.2.8.	Pago	359		1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$176,000.00								
362	3.3	Fin componente 3	220,258,277,2		0 days	Thu 4/13/23	Thu 4/13/23	\$0.00								
363	4	Efectividad y Elegibilidad de la operación			349 days	Wed 10/24/18	Mon 2/24/20	\$0.00								
364	4.1	Firma de Contrato			88 days	Wed 10/24/18	Fri 2/22/19	\$0.00								
365	4.2	Contrato de Préstamo aprobado por el Congreso Nacional	364		195 days	Mon 2/25/19	Fri 11/22/19	\$0.00								
366	4.3	Elegibilidad Total	365		66 days	Mon 11/25/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
367	4.3.1	NG art. 4.01 a) Informes jurídicos fundados	364,365		66 days	Mon 11/25/19	Mon 2/24/20	\$0.00								
368	4.3.2	NG art. 4.01 b) Designación de Funcionarios autorizados para solicitar desembolsos	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
369	4.3.3	NG art. 4.01 c) Cuenta Bancaria	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
370	4.3.4	NG art. 4.01 d) Verificación de Sistema Financiero y estructura de control interno	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
371	4.3.5	EE cláusula a) Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, CDEEE y EDESUR	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
372	4.3.7	EE cláusula a) Designación de EdG mínimo	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
373	4.3.8	EE cláusula b) Manual Operativo aprobado y en vigencia	364,365		30 days	Mon 11/25/19	Fri 1/3/20	\$0.00								
374	5	Fin Proyecto	115,158,362		0 days	Thu 4/13/23	Thu 4/13/23	\$0.00								

