




Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO				
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY				
Número(s) de Préstamo:	2500/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	115.700.000,00	BID Original:	115.700.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	115.700.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	115.700.000,00	Co-financiamiento/País:	84.080.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	199.780.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Mar 24, 2011
		Validado por Representante de País:	Apr 24, 2011

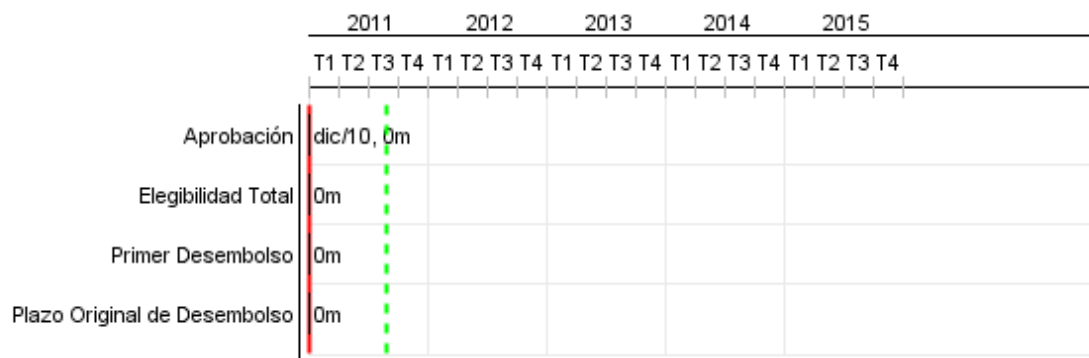

Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados
Resultado: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12,00	2011	P	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
				A						
Aumento volumétrico na capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê (10)6	m3		2011	P		0,80	1,30	1,80	2,80	2,80
				A						
Famílias retiradas das áreas de inundação, no trecho superior da bacia do rio Tietê	familias		2011	P	440,00	2.240,00	4.040,00	5.140,00	5.500,00	5.500,00
				A						

Resultado: Opções de recreação beneficiam poblacion na área do projeto

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
População beneficiada com opções de recreação.	Miles de familias	50,00	2011	P	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
OBRAS									
Sistemas de Macro e Micro drenagem instalados	sistemas				2,00				15.736.000,00
Aterros nas áreas de várzeas dispostos adequadamente	Miles de m3				1.150,00				19.279.000,00
Nucleos implantados	nucleos				3,00				38.550.000,00
Vías parque implantadas	km				41,00				17.620.000,00
Ciclovías implantadas	km				41,00				4.405.000,00
REASSENTAMENTO									
FAMILIAS REASSENTADAS	familias				500,00				56.599.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL									
Matas Ciliares recompostas	km2				125,00				16.363.000,00
Plano de Gestao do Parque implantado	plano				1,00				1.498.000,00
Plan de gestión del PVT elaborado e implementado	plano				1,00				1.380.000,00
Educação ambiental realizada.	plano				15,00				2.368.000,00
OUTROS									
TOTAL									173.798.000,00
