



Operation Number: **BR-L1297**
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
 Last Update: **3/21/2016**
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/31/2016**
 Division Chief validation date: **03/31/2016**
 Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus - PROSAMIM III	Loan Number:	2676/OC-BR
Executing Agency (EA):	UGP Igarapes de Manaus		
Team Leader:	Nery,Claudia Regina Borges	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado de Amazonas	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1297	\$280,000,000.00	\$280,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$400,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1297	\$280,000,000.00	\$173,248,483.38	61.87%	\$106,751,516.62


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	A
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	El contratista ha realizado progresos significativos en la gestión ambiental y social de la obra, en particular en el ámbito de salud y seguridad, incluyendo una auditoría en dicho campo y el seguimiento de sus recomendaciones.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

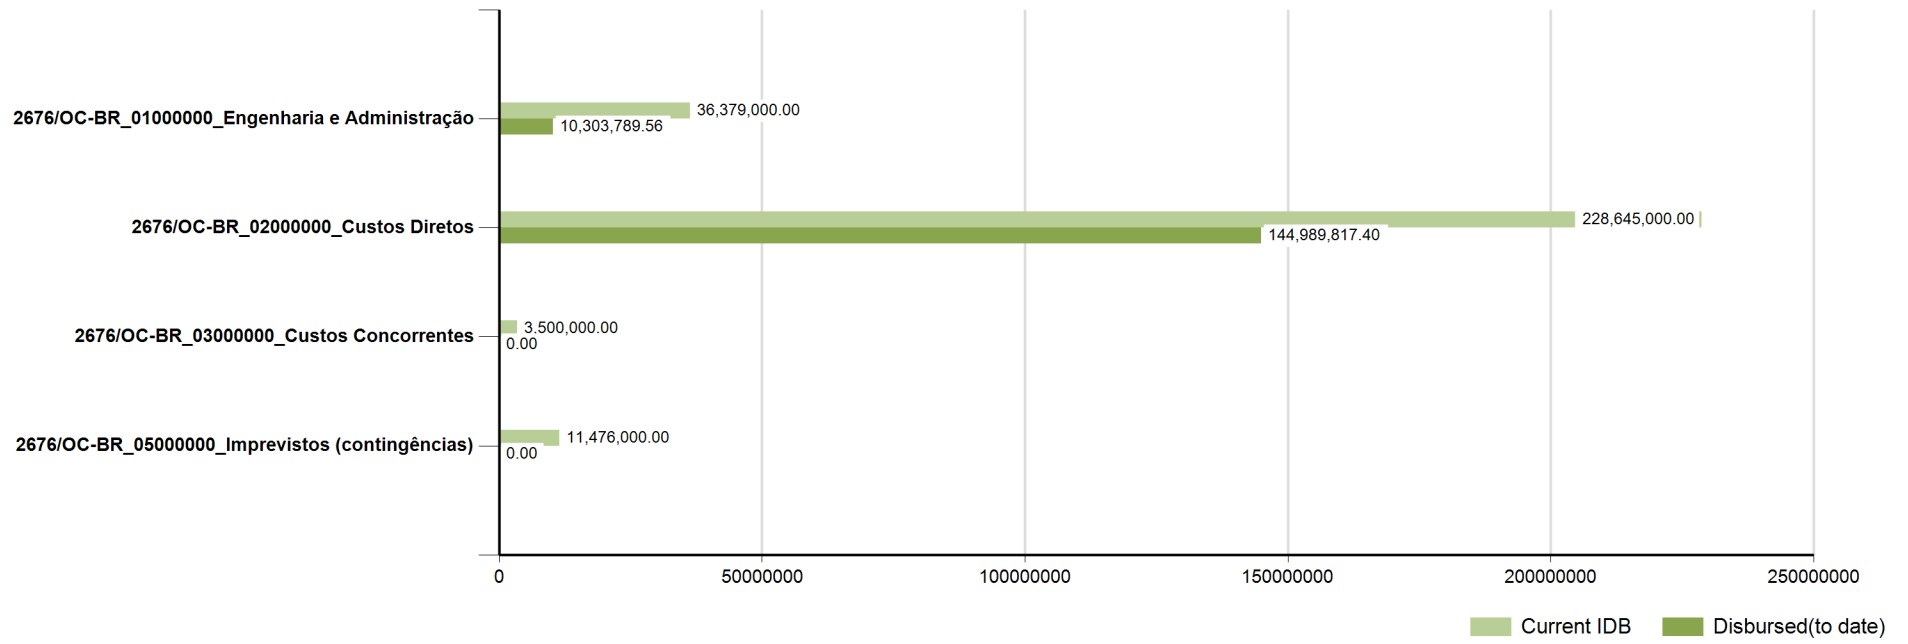

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condições de vida dos habitantes da Bacia dos Igarapés de São Raimundo (cidade de Manaus - AM) melhoradas								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017	EOP	
1.1 Incidência de verminoses em crianças de idade escolar, na zona de atuação do projeto		percentual	43.00	2003	Convênio UGPE, Fundação de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Educação e Secretaria Municipal de Educação	Relatórios semestrais e Plano de NTD	P		20.00
	P(a)						20.00	20.00	
	A								
1.2 Redução de Áreas Alagadas		ha	45.00	2011	UGPE	Diferença entre a área alagada existente (45 ha) e a área alagável após a conclusão das intervenções de drenagem (3ha).	P		3.00
	P(a)						3.00	3.00	
	A								
1.3 População dos bairros integrantes da área de intervenção direta do programa beneficiada		pessoas	0.00	2011	Sistema de gerenciamento do Programa da UGPE (SIGPRO)		P		75,960.00
	P(a)						75,960.00	75,960.00	
	A								

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada
Observation:	

1.4 Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1		NMP/100mL	430,000.00	2011	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 1000 NMP/100mL de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P							1,000.00
							P(a)						1,000.00	1,000.00
							A			0.00	93,000.00			93,000.00

1.5 Nitrogênio amoniacal no Ponto 1		mgN/L	42.80	2011	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 2 mgN/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						2.00	
							P(a)					2.00	2.00	
							A			0.00	2.17			2.17
Outcome:	2 Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
2.1 DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1		mgO2/L	45.00	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 5 mgO2/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						5.00
							P(a)					5.00	5.00
							A			0.00	30.50		

2.4 Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1		NMP/100mL	930,000.00	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAS)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 1000 NMP/100mL de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						1,000.00	
							P(a)					1,000.00	1,000.00	
							A			0.00	3,500.00			3,500.00

2.5 Nitrogênio amoniacal no Ponto 1		mgN/L	4.60	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 2 mgN/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						2.00	
							P(a)					2.00	2.00	
							A			0.00	5.96			5.96
Outcome:	3 Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada													
Observation:														

3.4 Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2		NMP/100mL	360,000.00	2011	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 1000 NMP/100mL de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P							1,000.00
							P(a)						1,000.00	1,000.00
							A			0.00	79,000.00			79,000.00

3.5 Nitrogênio amoniacal no Ponto 2		mgN/L	1.20	2011	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 2 mgN/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						2.00	
							P(a)					2.00	2.00	
							A			0.00	0.72			0.72
Outcome:	4 Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2		mgO2/L	23.00	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAS)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 5 mgO2/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P						5.00
							P(a)					5.00	5.00
							A			0.00	1.00		

4.4 Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2		NMP/100mL	110,000.00	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 1000 NMP/100mL de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P							1,000.00
							P(a)						1,000.00	1,000.00
							A			0.00	16,000.00			16,000.00

4.5 Nitrogênio amoniacal no Ponto 2		mgN/L	1.50	2012	Análises coletadas semestralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	Foi identificado a necessidade da definição de uma nova linha de base, cujo o levantamento será acompanhado pelo consultor ambiental do Banco. A meta no final do projeto é de 2 mgN/L de acordo com o requerido pela legislação Ambiental Brasileira	P							2.00
							P(a)						2.00	2.00
							A			0.00	3.73			3.73

Outcome: 5 Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas das sub-bacia do São Raimundo realizada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
5.1 Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas da sub-bacia do São Raimundo		m3/dia	0.00	2011	Relatório da concessionária de água e esgoto sanitário	Ainda não foi possível realizar obras de esgotamento sanitário	P	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	9.00
							P(a)	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	9.00	9.00
							A			0.00	0.00			0.00
5.2 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Domicílios	0.00	2013	Relatório da concessionária de água e esgoto sanitário	Ainda não foi possível realizar obras de esgotamento sanitário	P							0.00
							P(a)				1,227.00	0.00	3,680.00	3,680.00
							A			0.00	0.00			0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Produto 1: Canais de Macro drenagem construídos	metros	P	645.92	2,491.00	P	4,288,130.00	20,616,000.00
		P(a)	370.00	2,393.66	P(a)	3,403,170.56	14,546,350.04
		A	431.90	1,368.90	A	1,204,660.94	7,527,344.59
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros	P	6,639.26	27,584.00	P	1,042,790.00	3,686,000.00
		P(a)	9,715.00	22,063.33	P(a)	818,039.83	7,191,919.50
		A	2,478.05	7,346.54	A	452,628.42	2,225,896.36
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais	P	180.00	1,242.00	P	5,812,050.00	91,655,990.00
		P(a)	173.00	396.00	P(a)	6,635,176.54	32,702,839.43
		A	137.00	358.00	A	6,599,192.03	29,586,512.43
Produto 4: Sistema Viário construído	metros	P	1,375.39	5,390.00	P	3,080,900.00	10,781,010.00
		P(a)	1,800.00	6,880.38	P(a)	2,579,529.10	20,566,860.80
		A	853.63	1,432.93	A	2,839,136.63	6,726,058.50
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²	P	12,980.30	70,002.98	P	6,010,250.00	48,525,010.00
		P(a)	15,000.00	46,960.08	P(a)	6,445,508.44	48,706,047.09
		A	4,000.93	37,907.93	A	6,875,252.92	25,451,381.40
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema	P		1.00	P	8,087,610.00	51,509,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	3,630,044.02	29,835,815.09
		A	0.00	0.00	A	419,987.16	1,042,939.97
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios	P	2,286.00	11,062.00	P	755,270.00	5,115,000.00
		P(a)	200.00	10,678.00	P(a)		6,776,033.27
		A	142.00	358.00	A	0.00	102,692.37
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias	P	492.00	4,171.00	P	7,315,000.00	58,862,343.26
		P(a)	605.00	4,171.00	P(a)	1,926,911.80	69,003,180.00
		A	587.00	3,941.00	A	4,965,106.83	61,216,241.33
Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano	P		1.00	P		4,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,980,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres	P	30.00	170.00	P	73,950.00	424,000.00
		P(a)	73.00	172.00	P(a)	141,000.00	778,000.00
		A	73.00	105.00	A	279,473.85	279,473.85
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano	P		1.00	P		1,250,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	571,509.00	1,363,000.00
		A	0.00	0.00	A	52,781.89	129,253.47
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano	P		1.00	P		600,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	253,000.00	784,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 13: Conclusão Plano de Contingência para Bacia do Quarenta/Educandos	plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	33,000.00	238,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 14: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos, Plano Diretor de Coleta Seletiva e Melhoria do Sistema de Tecnologia de Informação	plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	99,000.00	295,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Outros							

Remanescente PROSAMIM I		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP
Produto 15: Obras de Macro drenagem executadas (Canais de Água Reabilitados e Galerias de Macro drenagem construídas)	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	426.00	P(a)	3,047,091.04
		A	0.00	A	0.00
Produto 16: Vias urbanas implantadas	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	426.00	P(a)	273,518.48
		A	0.00	A	0.00
Produto 17: Parques urbanos implantados	ha	P	0.00	P	0.00
		P(a)	1.38	P(a)	654,482.06
		A	0.00	A	0.00
Produto 18: Redes de esgoto construídas	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	3,000.00	P(a)	98,482.94
		A	0.00	A	0.00
Produto 19: Conexões disponibilizadas	conexões	P	0.00	P	0.00
		P(a)	139.00	P(a)	600,000.00
		A	0.00	A	0.00
Produto 20: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias	P	0.00	P	0.00
		P(a)	114.00	P(a)	949,974.91
		A	0.00	A	0.00
Ações Complementares PROSAMIM II		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP
Produto 21: Reassentamento	famílias	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	105.00	105.00	A
Produto 22: OBRAS DE MACRODRENAGEM EXECUTADAS (CANAIAS DE ÁGUA REABILITADOS E GALERIAS DE MACRODRENAGEM CONSTRUIDAS)	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	139.39	139.39	A
Produto 23: COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUIDAS (MICRODRENAGEM)	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	5,699.35	5,699.35	A
Produto 24: UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS	unidades	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	50.00	50.00	A
Produto 25: VIAS URBANAS IMPLANTADAS (SISTEMA VIÁRIO)	metros	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	2,043.00	2,043.00	A
Produto 26: OBRAS DE ARTE (PONTES OU VIADUTOS) CONSTRUIDAS	obras de arte	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.70	0.70	A
Produto 27: PARQUES URBANOS IMPLANTADOS	ha	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	41.30	41.30	A
Produto 28: ACESSO À ÁGUA POTÁVEL REGULARIZADO (QUADRA BAIRRO)	unidades	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	60.00	60.00	A
Produto 29: LIGAÇÕES DOMICILIARIAS À REDE PÚBLICA DE ESGOTO INSTALADO	unidades	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	60.00	60.00	A

Passivo PROSAMIM I		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP
Produto 30: Correção do Passivo	Plano	P	0.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	5,488,212.91
		A	0.00	A	0.00
Passivo PROSAMIM II		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP
Produto 31: Correção do Passivo	Plano	P	0.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	5,066,992.95
		A	0.00	A	0.00
Other Cost		2015	Cost		
Outros custos	P	\$30,000,000.00	\$102,976,041.57		
	P(a)	\$17,000,000.00	\$132,054,594.32		
	A	\$6,074,896.75	\$36,480,788.77		
Total Cost		2015	Total Cost		
	P	\$66,465,950.00	\$400,000,394.83		
	P(a)	\$43,535,889.29	\$400,000,394.83		
	A	\$44,763,117.42	\$185,768,583.04		

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Produto 31: Correção do Passivo	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 30: Correção do Passivo	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 29: LIGAÇÕES DOMICILIARIAS Á REDE PÚBLICA DE ESGOTO INSTALADO	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 28: ACESSO Á ÁGUA POTÁVEL REGULARIZADO (QUADRA BAIRRO)	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 27: PARQUES URBANOS IMPLANTADOS	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 26: OBRAS DE ARTE (PONTES OU VIADUTOS) CONSTRUÍDAS	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 25: VIAS URBANAS IMPLANTADAS (SISTEMA VIÁRIO)	Modify Output name	A numeração dos produtos foi corrigida.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 32: Conexões disponibilizadas	Delete Output	Foi incluído neste ciclo de forma incorreta.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 31: Redes de esgoto construídas	Delete Output	Foi incluído neste ciclo de forma incorreta.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 25: INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	Delete Output	Foi incluído neste ciclo de forma incorreta.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 14: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos, Plano Diretor de Coleta Seletiva e Melhoria do Sistema de Tecnologia de Informação	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 13: Conclusão Plano de Contingência para Bacia do Quarenta/Educandos	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016

Output	Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	Modify Financial P(a) value	A meta foi reprogramada em função da variação cambial. Os recursos foram realocado de acordo com a necessidade do programa.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	Modify Financial P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. A meta foi atualizada de acordo com a necessidade atual do projeto.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 7: Domicílios conectados	Modify Financial P(a) value	Acréscimo devido a entrada da quadra bairro Mestre Chico II e redução 1.038 unidades devido as quadras bairros suprimidas	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	Modify Financial P(a) value	Acréscimo de 1.196 metros no Parque Rio Negro, 1.216,17 metros na Quadra Bairro mestre chico II e redução 1.049,28 metros da quadras bairro suprimidas	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	Modify Financial P(a) value	Acréscimo de 26.345 m² PRN, e redução de 10.092 m² Parque Castelhana Fase1 e afluente, 19.706 m² do Parque da cultura Amazônica e 8.840 m² do Parque Belchior	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 4: Sistema Viário construído	Modify Financial P(a) value	Acréscimo de 495,30 metros no PRN, 221 metros no Igarapé Belchior, 262,52 metros na Ligação Viária Ramos Ferreira/Leonardo Malcher, 436,67 metros ligação Viária Luiz Antony e 3000 metros da Ligação viária São RAIMUNDO Glória e redução de 315 metros da Wilker de matos, 398,43 metros da quadra bairro 1C da Presidente Vargas, 179,45 da Ligação Viária São Francisco e 220,43 metros da ligação viária Presidente Dutra	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 3: Unidades habitacionais construídas	Modify Financial P(a) value	No projeto inicial previsto era 1254 UH, sendo que foi reduzido 258 UH da Quadra Bairro Castelhana, 216 UH na quadra bairro Glória, 156 da quara bairro belchior, 18 UH na quadra bairro São Raimundo e 390UH na Quadra bairro presidente vargas e Acrescido 180 UH na Quadra Bairro Mestre Chico II	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	Modify Financial P(a) value	Acréscimo de 1.370,74 metros no PRN, na Quadra Bairro Mestre Chico II 2.006,01 metros, Ligação viária Luiz Antony de 1.931,71 metros, Cacimbas 662,03 metros, Ligação Viária Presidente Dutra 910,54 metros, Ligação Viária Ramos Ferreira e Leonardo Malcher e Belchior de 92,54 e redução de 914,57 da quadra bairro 1C na Presidente Vargas e retirada da QD bairro Aparecida 1.574,99	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	Modify Financial P(a) value	Acréscimo de 28,72 metros em função do prologamento da galeria do Belchior e redução do de 287 metros correspondentes a macrodrenagem do Castelhana fase 1 e afluente e teve acréscimo de 162 metros no parque castelhana. Financeiro aumentou em função do pagamento da medição de dez/14, e pagamento sem meta em função da meta física.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 32: Conexões disponibilizadas	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	3/16/2016	3/16/2016

Output	Produto 31: Redes de esgoto construídas	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 25: INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	Modify Physical P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. A meta foi atualizada de acordo com a necessidade atual do projeto.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 7: Domicílios conectados	Modify Physical P(a) value	Acréscimo devido a entrada da quadra bairro Mestre Chico II e redução 1.038 unidades devido as quadras bairros suprimidas	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	Modify Physical P(a) value	Acréscimo de 26,345 m ² PRN, e redução de 10.092 m ² Parque Castelhana Fase1 e afluente, 19.706 m ² do Parque da cultura Amazônica e 8.840 m ² do Parque Belchior	3/16/2016	3/16/2016
Output	Praças em Áreas Remanescentes	Create Milestone	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 4: Sistema Viário construído	Modify Physical P(a) value	Acréscimo de 495,30 metros no PRN, 221 metros no Igarapé Belchior, 262,52 metros na Ligação Viária Ramos Ferreira/Leonardo Malcher, 436,67 metros ligação Viária Luiz Antony e 3000 metros da Ligação viária São RAIMUNDO Glória e redução de 315 metros da Wilker de matos, 398,43 metros da quadra bairro 1C da Presidente Vargas, 179,45 da Ligação Viária São Francisco e 220,43 metros da ligação viária Presidente Dutra	3/16/2016	3/16/2016

Output	Produto 3: Unidades habitacionais construídas	Modify Physical P(a) value	No projeto inicial previsto era 1254 UH, sendo que foi reduzido 258 UH da Quadra Bairro Castelhana, 216 UH na quadra bairro Glória, 156 da quadra bairro Belchior, 18 UH na quadra bairro São Raimundo e 390UH na Quadra bairro presidente Vargas e Acrescido 180 UH na Quadra Bairro Mestre Chico II	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	Modify Physical P(a) value	Acréscimo de 1.370,74 metros no PRN, na Quadra Bairro Mestre Chico II 2.006,01 metros, Ligação viária Luiz Antony de 1.931,71 metros, Cacimbas 662,03 metros, Ligação Viária Presidente Dutra 910,54 metros, Ligação Viária Ramos Ferreira e Leonardo Malcher e Belchior de 92,54 e redução de 914,57 da quadra bairro 1C na Presidente Vargas e retirada da QD bairro Aparecida 1.574,99	3/16/2016	3/16/2016
Output	Produto 1: Canais de Macro drenagem construídos	Modify Physical P(a) value	Acréscimo de 28,72 metros em função do prolongamento da galeria do Belchior e redução de 287 metros correspondentes a macro drenagem do Castelhana fase 1 e afluente e teve acréscimo de 162 metros no parque castelhana. Financeiro aumentou em função do pagamento da medição de dez/14, e pagamento sem meta em função da meta física.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Passivo PROSAMIM II	Create Component	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Correção do Passivo	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Passivo PROSAMIM I	Create Component	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Correção do Passivo	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Ações Complementares PROSAMIM II	Create Component	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 29: LIGAÇÕES DOMICILIARIAS Á REDE PÚBLICA DE ESGOTO INSTALADO	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Produto 28: ACESSO À ÁGUA POTÁVEL REGULARIZADO (QUADRA BAIRRO)	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 27: PARQUES URBANOS IMPLANTADOS	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 26: OBRAS DE ARTE (PONTES OU VIADUTOS) CONSTRUÍDAS	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Produto 25: VIAS URBANAS IMPLANTADAS (SISTEMA VIÁRIO)	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 24: UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 23: COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS (MICRODRENAGEM)	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Produto 22: OBRAS DE MACRODRENAGEM EXECUTADAS (CANAIS DE ÁGUA REABILITADOS E GALERIAS DE MACRODRENAGEM CONSTRUÍDAS)	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 21: Reassentamento	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 20: Número de famílias em situação de riscos reduzido	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Nº de famílias reassentadas por meio da opção Auxílio Moradia	Create Milestone	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Número de famílias reassentadas em unidades construídas pelo PROSAMIM	Create Milestone	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Nº de famílias reassentadas por meio da opção indenização	Create Milestone	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Produto 19: Conexões disponibilizadas	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 18: Redes de esgoto construídas	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 17: Parques urbanos implantados	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Output	Produto 16: Vias urbanas implantadas	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 15: Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água Reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas)	Modify Unit of Measure	Produto incluído neste PMR, unidade de mensuração incluída de forma correta.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Remanescente PROSAMIM I	Create Component	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016
Output	Produto 15: Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água Reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas)	Create Output	Tendo em vista que o Estado do Amazonas já investiu todos os recursos previstos na fonte BID e Aporte Local nos Programas PROSAMIM I, SUPLEMENTAR e PROSAMIM II, a dificuldade econômica enfrentada pelo país o que impossibilita o aporte adicionais de recursos por parte do Estado, e que ainda encontram-se por concluir algumas obras importantes para o alcance dos objetivos dos referidos Programas e a necessidade de construir algumas pequenas obras para a correção de passivos ambientais e sociais identificados por ESG e a existência da desvalorização do real que resulta em sobra de recursos no PROSAMIM III, sem prejuízo das metas físicas e financeiras contratadas no âmbito do PROSAMIM III, optou-se prioritariamente apoiar o Estado na conclusão das referidas obras, antes de incorporar aumento de meta para o PROSAMIM III.	2/22/2016	3/16/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
