
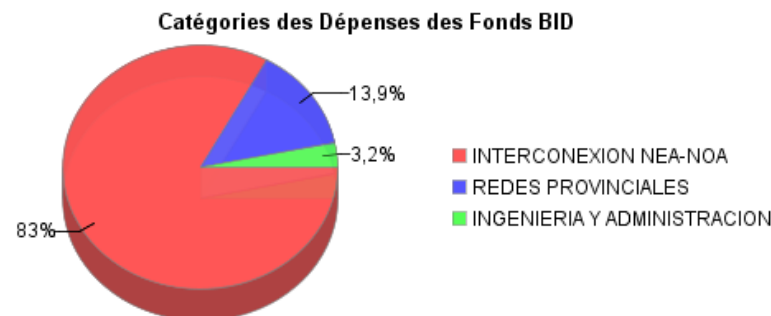



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	Montant Courant Approuvé:	580.000.000,00	Initial BID:	580.000.000,00
Secteur:	ENERGY-POWER LINES	Montant Décaissé à ce Jour:	521.496.370,68	Courant BID:	580.000.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	1764/OC-AR	% Décaissé:	89,91	Pari Passu:	80,00
Étape:	Approved	Solde:	58.503.629,32	Cofinancement/Pays:	145.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	Estimation Initiale:	725.000.000,00	Période d'Amortissement (mois):	234
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1095				
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A(R)	<input checked="" type="checkbox"/> Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011
		Validé par le Représentant: Oct 21, 2011

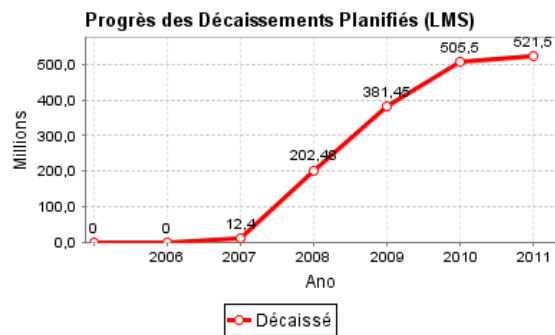

Progrès Cumulé à 2011

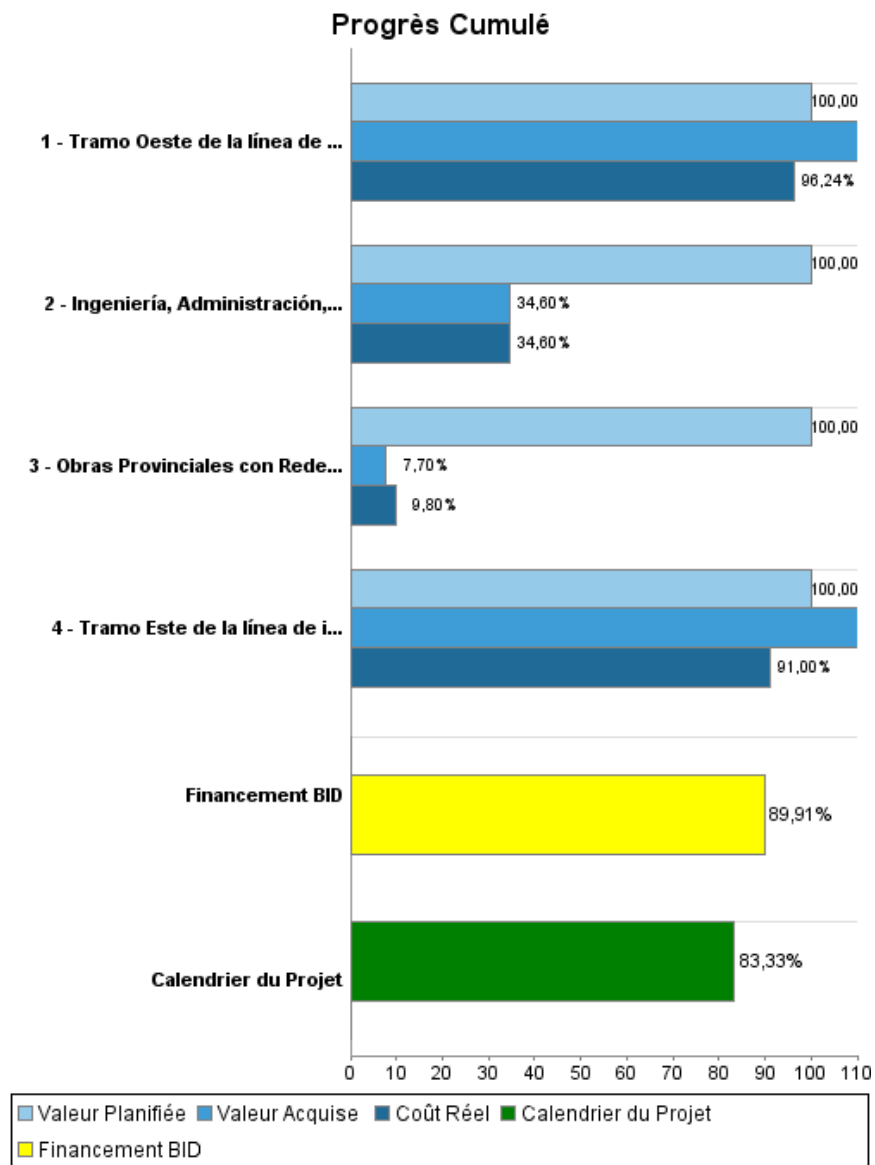

Résultats

Résultat: Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Aumento del grado de electrificación en la Región del Norte Grande	%	77,30	2003	P A	87,00	87,00

Résultat: Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Disminuye la relación de Energía no Suministrada (ENS) con respecto a la demanda abastecida en los sistemas de transmisión regional	MWh/año x10(-4)	2,54	2004	P A	2,16	2,16

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA									
Tramo Este de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km		410,60		571,00	13.185.000,00	30.886.000,00		489.681.000,00
Tramo Oeste de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km	83,00	352,00		637,00	37.039.000,00	14.795.000,00		504.005.000,00
Composante II - Obras civiles y electromecánicas para las redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande									
Obras Provinciales con Redes de transmisión, subtransmisión y Estaciones de transformación terminadas	Obras	10,00			20,00	141.909.000,00	4.274.000,00		203.691.000,00
Composante III - Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos									
Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos	0					28.611.000,00	1.943.000,00		40.123.000,00
TOTAL						220.744.000,00	51.898.000,00		1.237.500.000,00
