

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Secretaría de Turismo - SECTUR
Secteur:	TOURISM
Numéro(s) de Prêt(s):	1623/SF-HO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	TC0301053
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	35.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	19.506.948,77
% Décaissé:	55,73
Solde:	15.493.051,23

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	35.000.000,00
Courant BID:	35.000.000,00
Pari Passu:	94,83
Cofinancement/Pays:	5.850.000,00
Estimation Initiale:	40.850.000,00
Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B

Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011
 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011

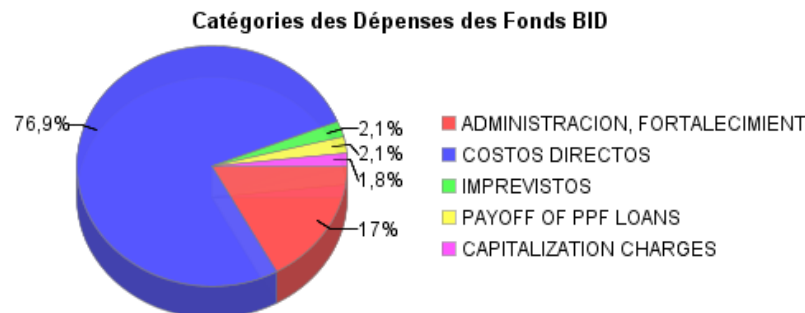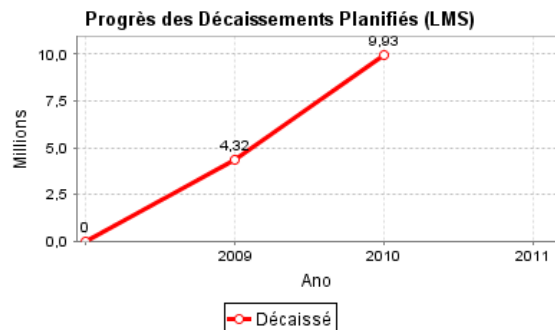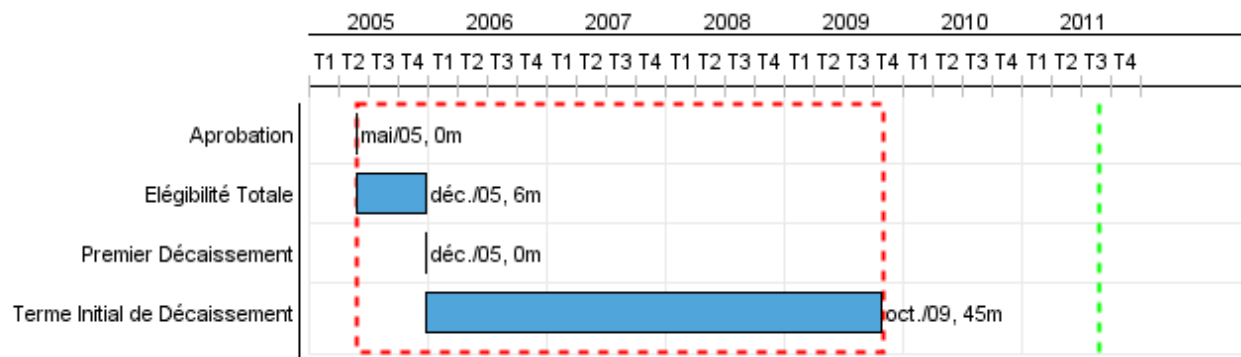


Progrès Cumulé à 2010

Progrès Cumulé

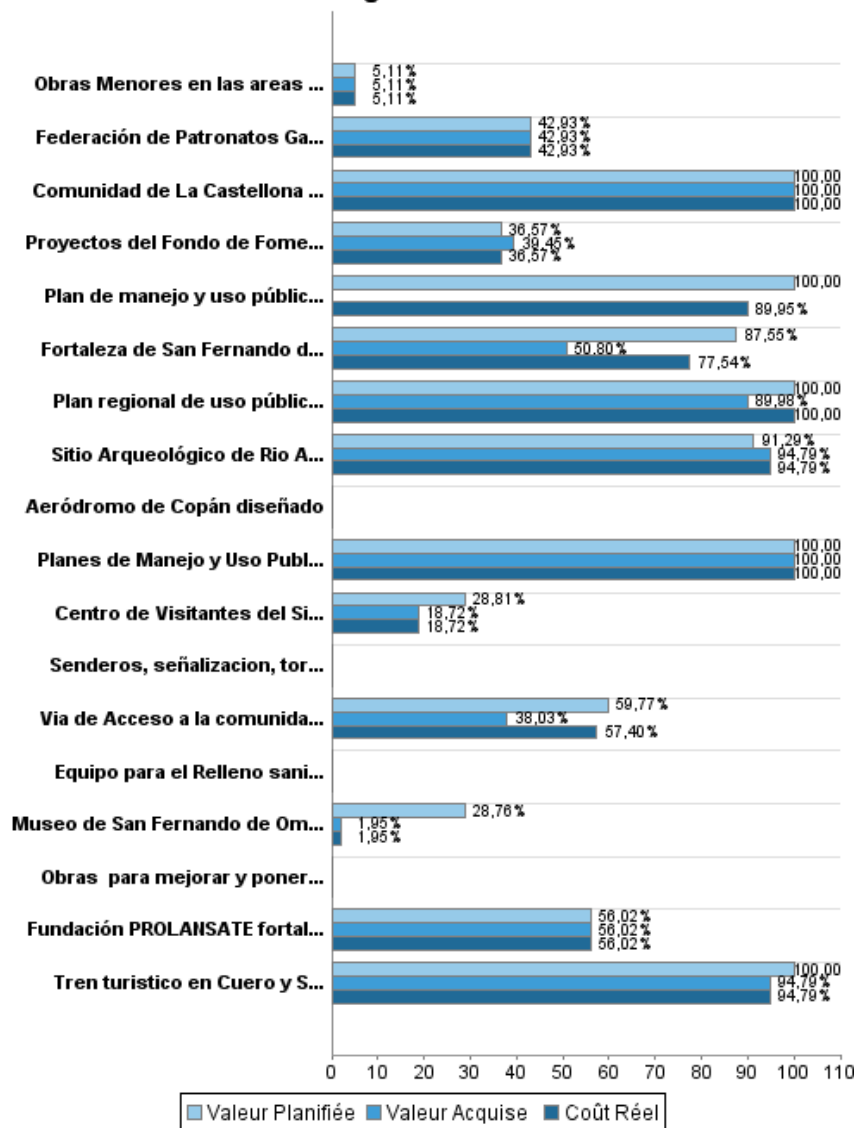

Progrès Cumulé

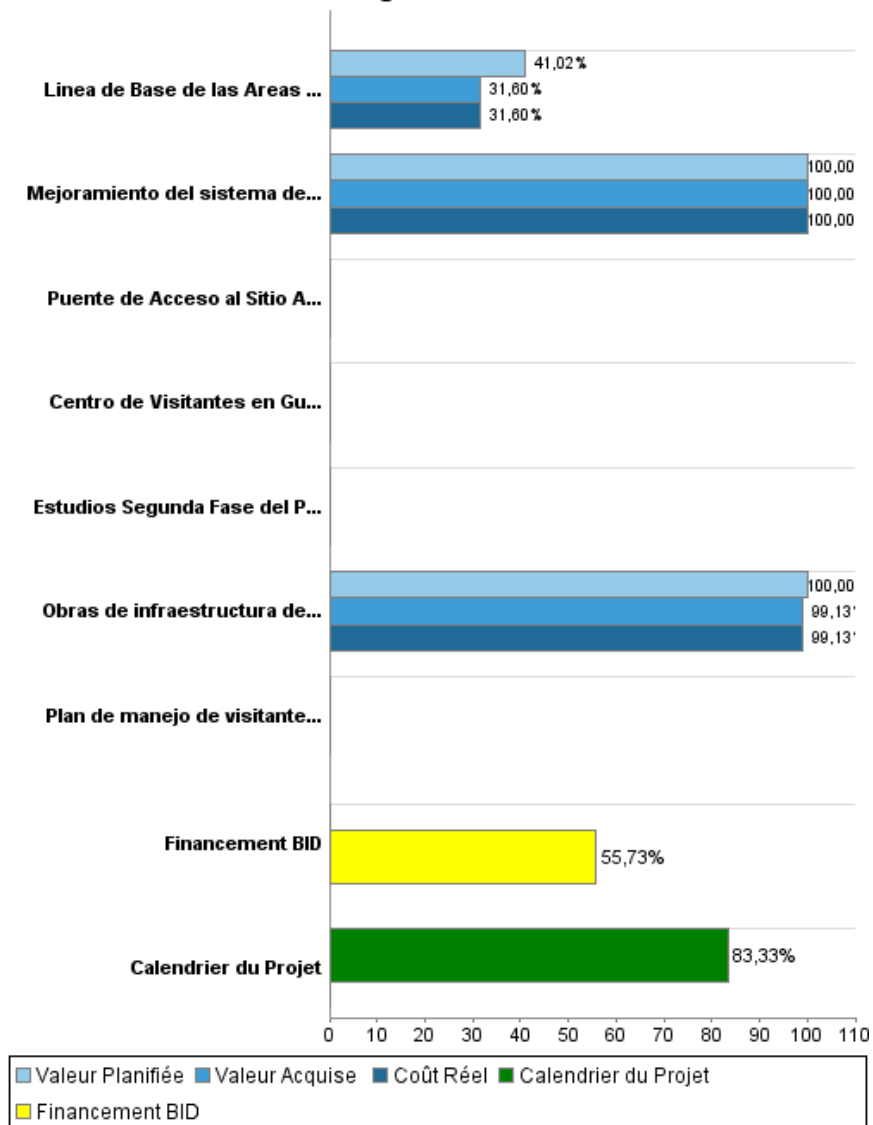

Résultats

Résultat:	Incrementar sostenidamente la actividad turística en Honduras mediante: consolidación y diversificación de productos turísticos, realización de inversiones priorizadas por la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, y catalización de inversiones
Suposições:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autoridades mantienen la voluntad política para continuar apoyando el desarrollo del sector. 2. Agentes privados muestran interés de invertir en las zonas beneficiadas. 3. Existe coordinación entre las instituciones, municipalidades y comunidades en las intervenciones del Programa. 4. Las comunidades beneficiarias participan y se apropian de los proyectos en sus localidades.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Visitantes totales	Visitantes	1.025.500,00	2004	P	1.300.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				A	1.336.600,00	1.611.200,00				
Gasto promedio ponderado del turista receptor	Dolares Americano al año	646,00	2004	P	680,00	703,00	715,00	730,00	745,00	730,00
				A	623,40	672,30				

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub									
Composante 1.1: Mundo Maya									
Planes de Manejo y Uso Publico para el Parque Arqueologico en Rio Amarillo Elaborados	plan				1,00				53.760,00
Sitio Arqueológico de Rio Amarillo Restaurado	sitio arqueológico				1,00	374.030,00	404.000,00		856.870,00
Centro de Visitantes del Sitio Arqueológico en Río Amarillo construido	centro de visitantes				1,00	250.000,00	154.600,00		945.690,00
Puente de Acceso al Sitio Arqueologico de Rio Amarillo Rehabilitado	puente				1,00				738.010,00
Via de Acceso a la comunidad de La Castellona	Kilometers	2,75	0,60		275,00	488.630,00	447.000,00		1.757.070,00
Comunidad de La Castellona Electrificada	Kilometers	8,58	8,58		8,50	27.210,00	27.210,00		100.250,00
Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de La Castellona realizado	Households				81,00				431.230,00
Plan de manejo de visitantes del Parque Arqueológico en Copan Ruinas elaborado	plan				1,00				130.000,00
Aeródromo de Copán diseñado	diseño				1,00				13.000,00
Plan de manejo y uso público de la Fortaleza formulado	plan	1,00			1,00	88.050,00	79.200,00		88.050,00
Fortaleza de San Fernando de Omoa Restaurada	Fortaleza	1,00			1,00	388.890,00	376.300,00		1.407.320,00
Museo de San Fernando de Omoa Construido	museo				1,00	150.000,00			1.118.820,00
Composante 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub									
Composante 1.2: Inversiones Prioritarias de la Estrategia Nacional Turismo Sostenible (ENTS)									
Centro de Visitantes en Lancetilla acondicionado y equipado	Centro de Visitantes				1,00	7.500,00	7.500,00		461.730,00
Fundación PROLANSATE fortalecida.	equipamiento				1,00	7.400,00	7.400,00		100.000,00
Linea de Base de las Areas Protegidas de la Bahía de Tela Levantada	estudio				1,00	138.060,00	105.000,00		351.220,00
Senderos, señalizacion, torres de observación y otras obras del Jardin Botanico Lancetilla, Parque Nacional Jeannette Kawas y Parque Nacional Punta Izopo contruidos	obras				1,00				900.880,00
Plan regional de uso público y mejoramiento ambiental de playas de la costa norte formulado	plan	1,00			1,00	25.050,00	25.050,00		250.050,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Tren turístico en Cuero y Salado rehabilitado	tren	1,00	1,00		1,00	58.500,00	58.500,00		470.740,00
Obras Menores en las areas BC y D contenidas en el master plan paseo marítimo en Tela construidas	obras				1,00	35.840,00	35.840,00		1.401.250,00
Obras para mejorar y poner en marcha los Sistemas de Saneamiento en Islas de la Bahía construidas	obras				1,00				1.111.150,00
II Etapa de agua potable en Punta Gorda, Islas de la Bahía construida	Households				500,00				263.000,00
Centro de Visitantes en Guanaja Construido	centro de visitantes				1,00				224.000,00
Equipo para el Relleno sanitario de Tela comprado	equipamiento				1,00				900.000,00
Componente 2: Fomento de la Inversión Privada									
Obras de infraestructura de los Micos: (1) vías; (2) planta potabilizadora y redes de agua potable; (3) red de alcantarillado sanitario y planta de aguas negras; (4) red de alcantarillado construidas	obras	10,00	10,00		10,00	2.241.000,00	2.241.000,00		8.602.880,00
Federación de Patronatos Garífunas de Bahía de Tela Constituida	federación constituida				1,00	6.770,00	6.770,00		15.770,00
Proyectos del Fondo de Fomento al Turismo que benefician a micro, pequeñas y medianas empresas financiados	negocios	17,00	17,00		61,00	272.870,00	208.100,00		2.250.990,00
Gestión del Programa									
Estudios Segunda Fase del Proyecto	N/A				1,00				1.540.000,00
TOTAL						4.559.800,00	4.183.470,00		26.483.730,00
