

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	UGP Igarapes de Manaus		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2676/OC-BR		
Étape:	Approved		
Type d' Opération:	INV - Investissement		
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-P1442		
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	280.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	60.901.500,00
% Décaissé:	21,75
Solde:	219.098.500,00

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	280.000.000,00
Courant BID:	280.000.000,00
Pari Passu:	70,00
Cofinancement/Pays:	120.000.000,00
Estimation Initiale:	400.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	A
---	---

### Reformulation


( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?
---

### Validation

Validé par le Chef de Division:	10-dic-2012
Validé par le Représentant:	10-dic-2012

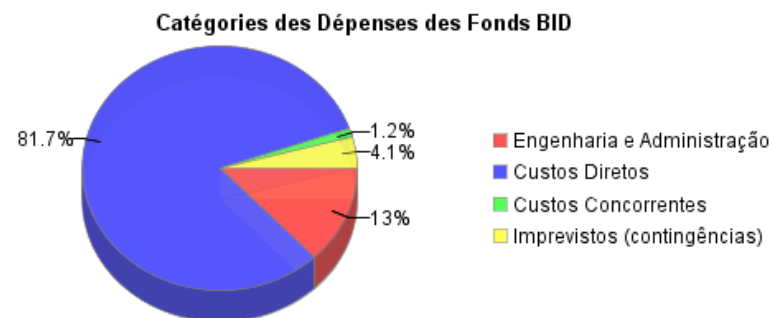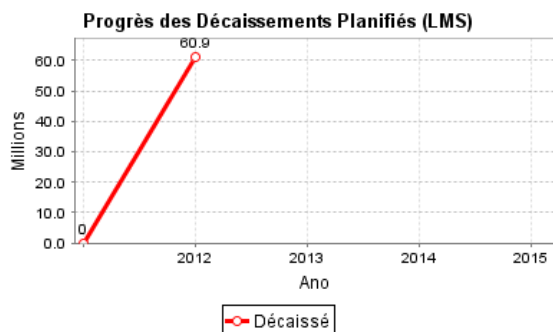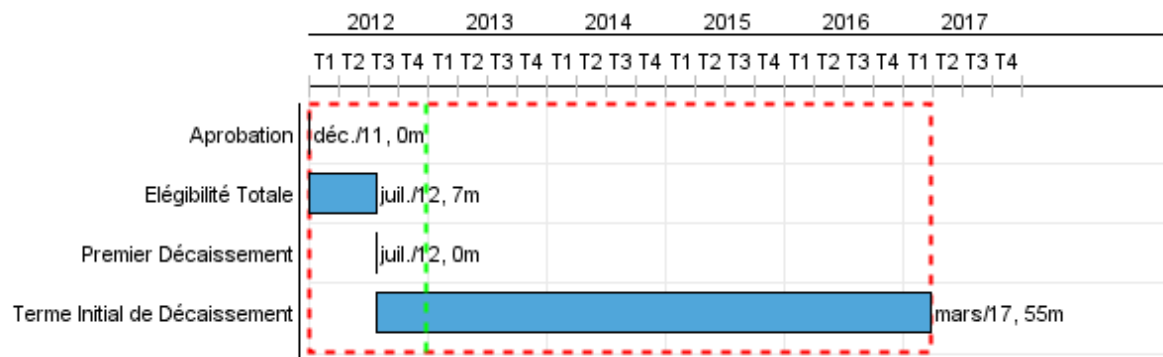

## Progrès Cumulé à 2012

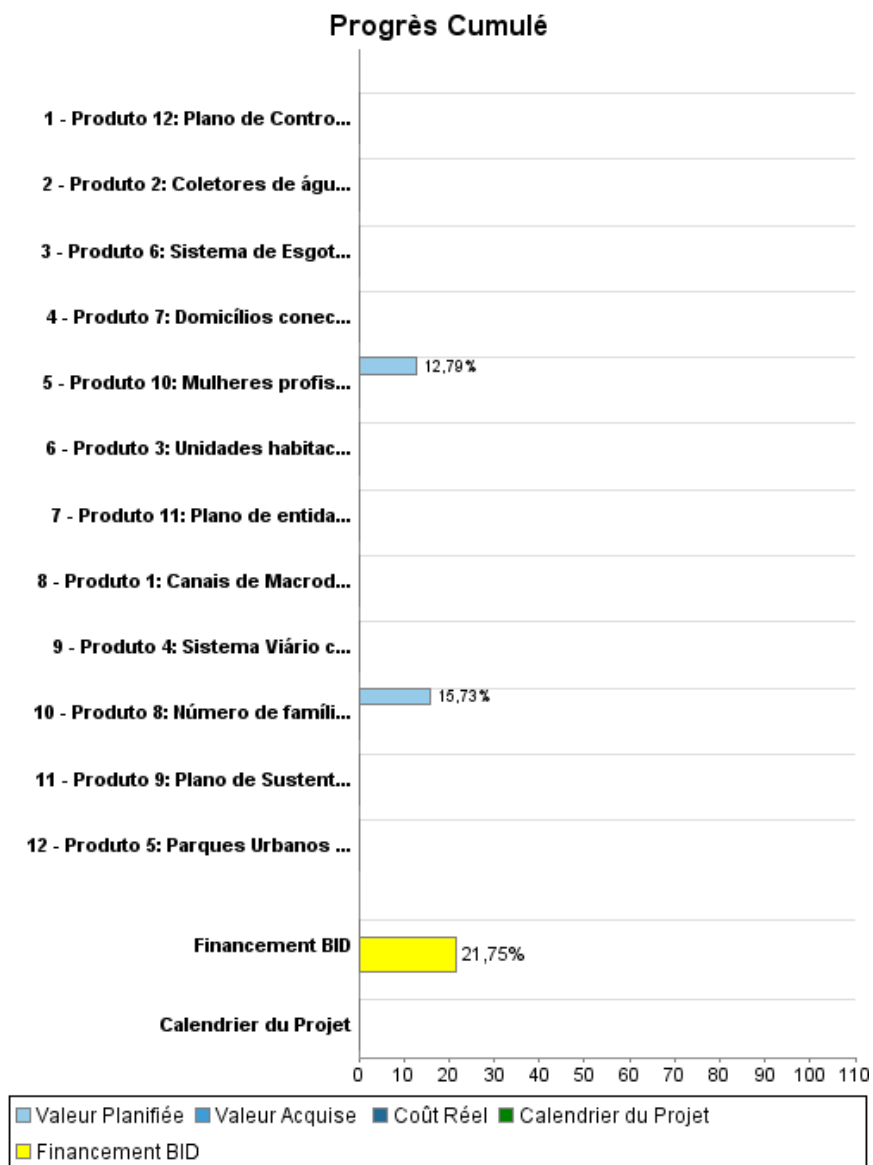

## Résultats

**Résultat:** Qualité da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	22.40	2011	P A							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	59.00	2011	P A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	67.00	2011	P A							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	430,000.00	2011	P A							1,000.00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	42.80	2011	P A							2.00

**Résultat:** Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	45.00	2012	P A							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	15.00	2012	P A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	139.00	2012	P A							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	930,000.00	2012	P A							1,000.00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	4.60	2012	P A							2.00

**Résultat:** Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	4.90	2011	P A							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	3.00	2011	P A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	21.00	2011	P A							



**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional</b>									
Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	metros				2.491,00				20.616.000,00
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros				27.584,00				3.686.000,00
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais				1.242,00				91.656.000,00
Produto 4: Sistema Viário construído	metros				5.390,00				10.781.000,00
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²				70.003,00				48.525.000,00
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema				1,00				51.509.000,00
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios				11.062,00				5.115.000,00
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias	152,00			3.959,00	9.260.000,00			58.862.000,00
<b>Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental</b>									
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano				1,00				4.000.000,00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres	22,00			172,00	54.230,00			424.000,00
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano				1,00				1.250.000,00
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano				1,00				600.000,00
<b>Outros</b>									
Outros custos	N/A					5.176.000,00			102.976.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>14.490.230,00</b>			<b>400.000.000,00</b>
