
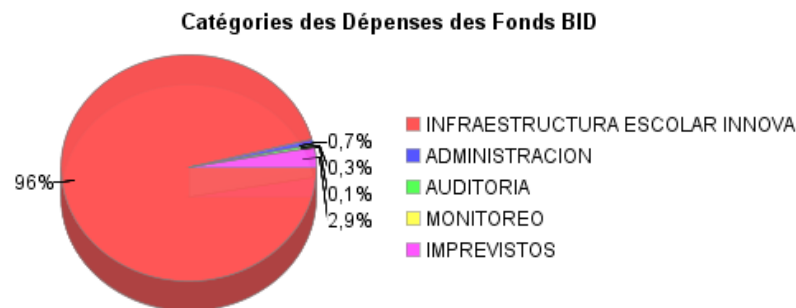
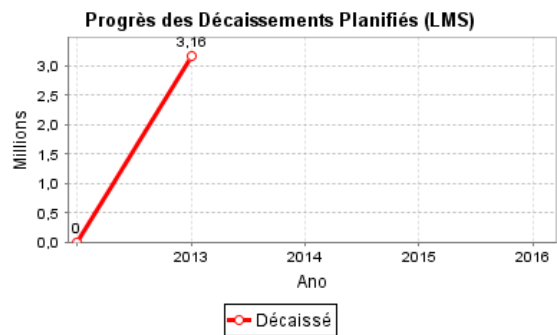



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION	Montant Courant Approuvé:	70.000.000,00	Initial BID:	70.000.000,00
Secteur:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION	Montant Décaissé à ce Jour:	3.161.546,66	Courant BID:	70.000.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	2734/OC-PN	% Décaissé:	4,52	Pari Passu:	88,00
Étape:	Approved	Solde:	66.838.453,34	Cofinancement/Pays:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement			Estimation Initiale:	80.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1083, RG-P1478			Période d'Amortissement (mois):	240
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	06-oct-2013
		Validé par le Représentant:	09-oct-2013

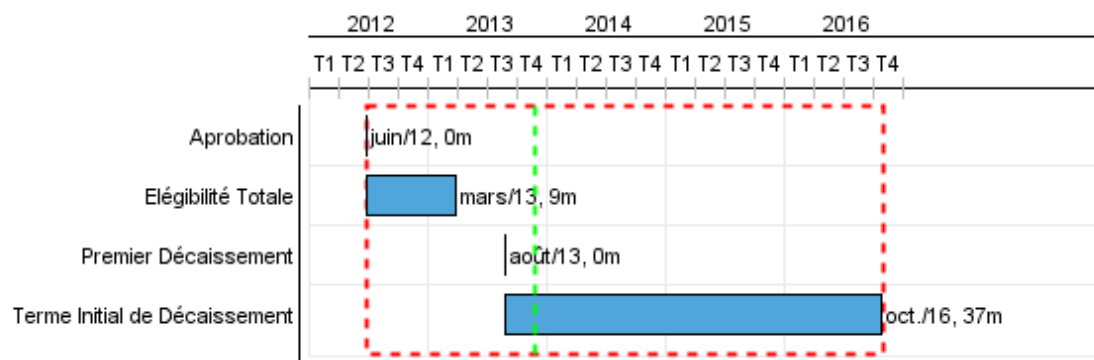

Progrès Cumulé à 2013

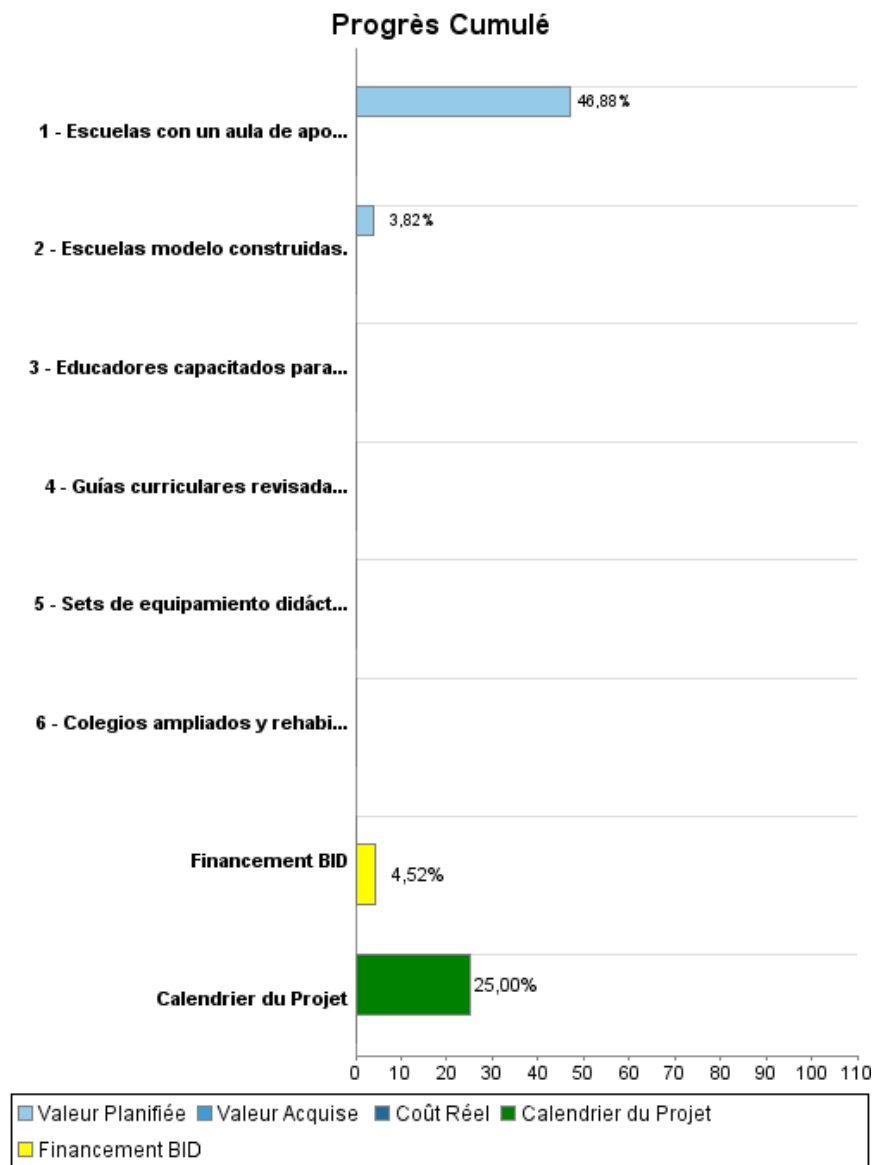

Résultats

Résultat:	Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.
Observações:	Se verificara los resultados en base de los datos colectados a través de la evaluación del programa e informes de monitoreo entregados por MEDUCA.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36.000,00	2.000,00	38.000,00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45,00	47,00	47,00

Résultat:	Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.
Observações:	Se verificara los resultados en base de la evaluación del programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45,00	2,00	47,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1: Infraestructura escolar innovadora									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00	1.000.000,00			26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				21,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00	1.500.000,00			3.200.000,00
Composante 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				70,00				3.182.260,00
Categoría 3: Administration									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
Categoría 4: Auditoria									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
Categoría 5: Monitoreo									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
Categoría 6: Imprevisto									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
TOTAL						2.500.000,00			80.000.000,00
