



Operation Number: **EC-L1110**  
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
 Last Update: **3/31/2015**  
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/17/2015**  
 Division Chief validation date: **05/01/2015**  
 Country Representative validation date: **05/01/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Financial Inclusion Support Investment Program	Loan Number:	2761/OC-EC
Executing Agency (EA):	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		
Team Leader:	Demichelis,Jose Francisco	Sector/Subsector:	FINANCIAL INCLUSION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1110	\$10,000,000.00	\$2,447,205.32	\$6,682,000.00	\$0.00	\$16,682,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1110	\$2,447,205.32	\$2,447,205.32	100.00%	\$0.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

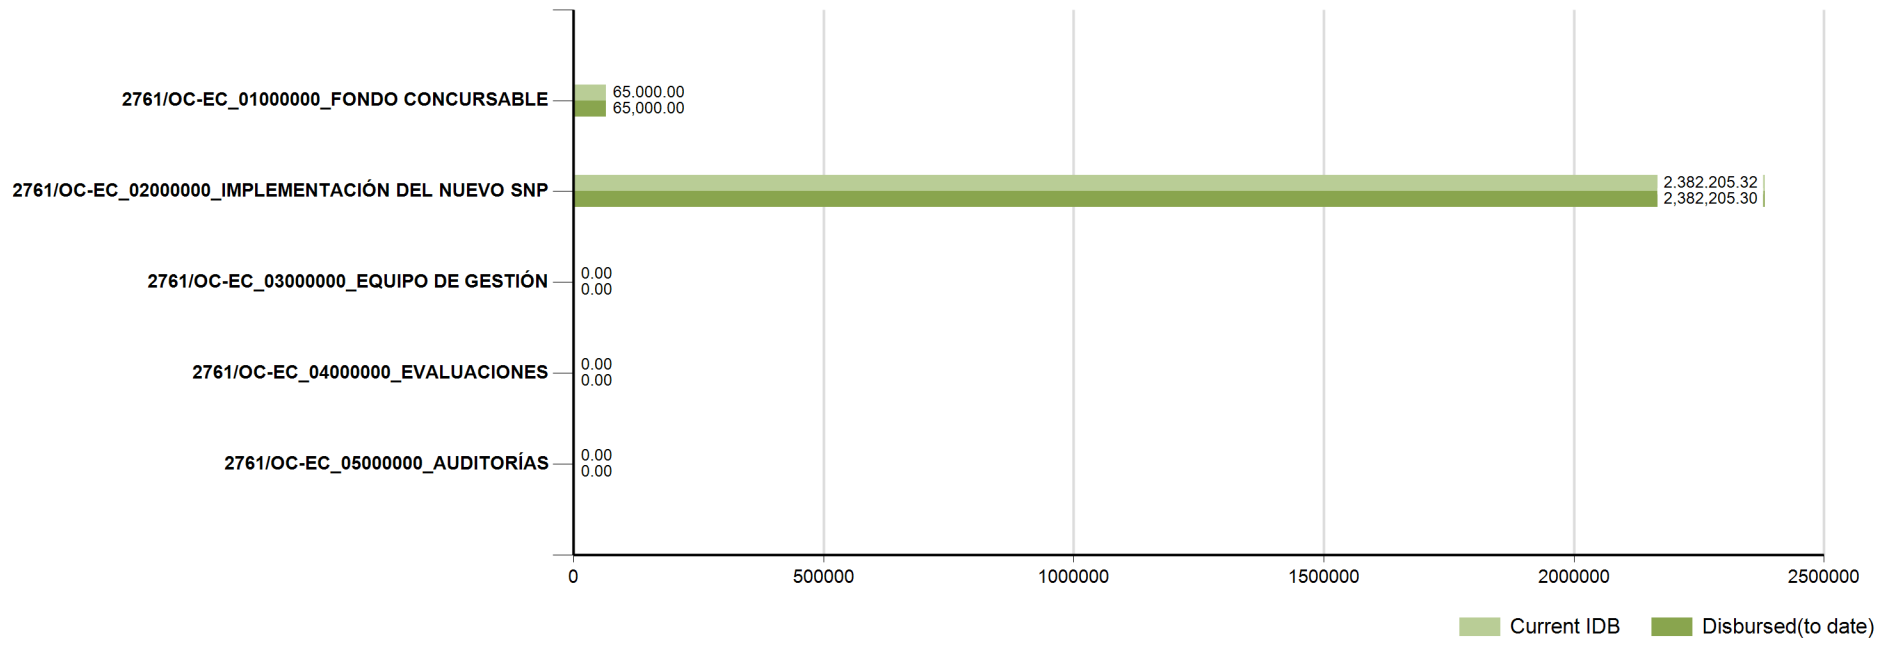

## Results Matrix

### Impacts

<b>Impact:</b>	1 Incremento del número de personas atendidas por el sistema financiero, especialmente las ubicadas en zonas de menor profundización financiera y menores niveles de ingreso.							
<b>Observation:</b>								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Número total de nuevos usuarios del sistema financiero, en las IFIs y EFPs beneficiarias del Programa, incrementado.		Número de usuarios	0.00	2011	Sistema de monitoreo del Programa, bases de IFIs y EFPs	Meta acumulativa	P	237,189.00
							P(a)	237,189.00
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

<b>Outcome:</b>	1 La oferta de servicios financieros, particularmente en zonas geográficas de menor profundización financiera y menores niveles de ingreso, incrementada.												
<b>Observation:</b>	No se registrarán las metas anuales hasta que no se realice el levantamiento de información para definir la línea de base.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Número de nuevas transacciones financieras realizadas por los usuarios de las IFIs y EFPs beneficiarias del Programa, incrementado.		Número de transacciones financieras	244,615.00	2011	Sistema de monitoreo del Programa, bases de IFIs y EFPs	Meta acumulativa	P				2,846,265.00	2,846,265.00	
							P(a)		0.00			2,846,265.00	2,846,265.00
							A	0.00	0.00				
1.2 Número de puntos de atención de las IFIs y EFPs beneficiarias del fondo concursable creados y operando.		Número de puntos de atención	628.00	2011	Sistema de monitoreo del Programa, bases de IFIs y EFPs	Revisar el dato de línea de base y las metas anuales	P	0.00			920.00	920.00	
							P(a)	0.00	0.00			920.00	920.00
							A	0.00	0.00				
<b>Outcome:</b>	2 Eficiencia transaccional del Sistema Nacional de Pagos mejorada												
<b>Observation:</b>	No se registrarán las metas anuales hasta que no se realice el levantamiento de información para la línea de base.												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP		
2.1 Tiempo promedio de procesamiento por transacción en el SNP reducido.		Minutos	300.00	2011	Estadísticas del SNP del BCE (periodicidad mensual)	Tiempo promedio desde generación de la orden de transacción hasta su acreditación en la cuenta del beneficiario final. La incorporación del nuevo SNP será progresiva. Este funcionará paralelamente con el actual SNP hasta tanto la estructura tecnológica de	P					180.00	180.00	
							P(a)					180.00	180.00	
							A	240.00	240.00					
2.2 Número de transacciones anuales que se procesan en línea en el SNP incrementado.		Número de transacciones financieras	760,133.00	2011	Estadísticas del SNP del BCE (periodicidad mensual)	Meta acumulativa	P					2,480,439.00	2,480,439.00	
							P(a)					2,480,439.00	2,480,439.00	
							A	1,159,055.00	115,055.00					
2.3 IFIs y EFPs integradas en la infraestructura de pagos del BCE con estándares de procesamiento directo (STP)		Número de IFIs y EFPs	132.00	2011	Informes semestrales del BCE, evaluaciones intermedia y final.	Meta acumulativa. Pendiente la revisión de la meta del 2013 y la meta acumulada.	P					232.00	232.00	
							P(a)					232.00	232.00	
							A	293.00	2.00					
2.4 Infraestructura (software y hardware) del SNP mejorada		% de implementación del plan de acción para mejorar la infraestructura	0.00	2011	Informes semestrales del BCE, evaluaciones intermedia y final.		P						100.00	
							P(a)							100.00
							A	56.00	82.00					

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress**

<b>COMPONENTE I. FONDO CONCURSABLE DE APOYO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA</b>		<b>Physical Progress</b>		<b>Financial Progress</b>			
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>	2014	EOP	2014	EOP		
IFIs y EFPs beneficiadas con proyectos de asistencia técnica, adquisición de bienes, servicios y/o tecnología aprobados en el Fondo Concursable.	IFIs y EFPs	P	30.00	85.00	P	2,042,800.00	5,360,000.00
		P(a)	30.00	0.00	P(a)	400,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudios complementarios al Programa de Inversión de Apoyo a la Inclusión Financiera	Estudios	P	4.00	4.00	P	150,500.00	155,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	65,500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	65,500.00
IFIs y EFPs capacitadas sobre los beneficios del uso de los recursos del Fondo Concursable.	Instituciones	P	30.00	90.00	P	245,000.00	735,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
<b>COMPONENTE II. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PAGOS</b>		<b>Physical Progress</b>		<b>Financial Progress</b>			
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>	2014	EOP	2014	EOP		
Reingeniería del SNP y productos financieros desarrollados	reingeniería y productos financieros	P		1.00	P	828,000.00	2,760,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	2,627,240.00
		A	1.00	1.00	A	618,240.00	2,627,240.00
Componentes de infraestructura TI adquiridos y operando	componentes de infraestructura TI	P	0.00	1.00	P	31,006.00	975,289.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,110,727.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	1,110,727.00
Cobertura del gateway XML complementada	Cobertura del Gateway y XML	P	1.00	1.00	P	25,000.00	25,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Software de gestión de TI adquirido y operando	Software	P	1.00	1.00	P	1,200,000.00	1,200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Billetera móvil insertada dentro de la plataforma del SNP y operando	Billetera móvil	P	0.00	1.00	P	4,000,000.00	4,000,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	0.00	4,730,614.08
		A	0.00	0.00	A	730,614.08	4,730,614.08
<b>ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		<b>Physical Progress</b>		<b>Financial Progress</b>			
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>	2014	EOP	2014	EOP		
Evaluación de impacto realizada	Evaluación	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación intermedia y final realizada	Evaluación	P		2.00	P		100,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auditorías concurrentes y externas realizadas	Informe	P	2.00	8.00	P	128,000.00	500,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	20,000.00	10,080.00
		A	1.00	1.00	A	10,080.00	10,080.00
<b>Other Cost</b>				<b>2014</b>	<b>Cost</b>		
Equipo de gestión		P		\$19,672.13	\$91,803.28		
		P(a)		\$50,000.00	\$138,000.00		
		A		\$377,926.82	\$465,926.82		

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$8,669,978.13	\$16,102,092.28
	P(a)	\$470,000.00	\$9,210,087.90
	A	\$1,736,860.90	\$9,010,087.90

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
