

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1020	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Innovation and Dissemination Local Cluster Competitiveness State of Pernambuco	<b>Loan Number</b>	2147/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	ESTADO DE PERNAMBUCO	<b>Sector/Subsector</b>	IN - INDUSTRY
<b>Team Leader</b>	RADAELLI, VANDERLEIA	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADO DE PERNAMBUCO		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C(R)	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1020	10,000,000	6,331,722.15	7,761,984	0	17,761,984	6,331,722.15	6,331,722.15	100.00%	0
Aggregated	10,000,000	6,331,722.15	7,761,984	0	17,761,984	6,331,722.15	6,331,722.15	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

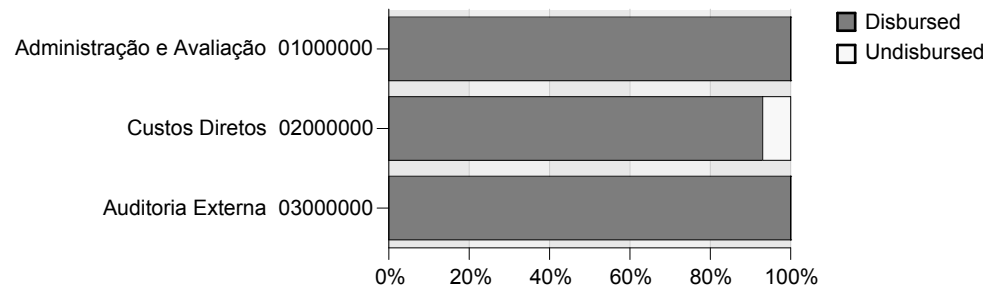

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Contribuir al crecimiento económico sostenible de Pernambuco, aumentando la competitividad de las empresas involucradas en los APLs del estado donde se pueden lograr resultados en el periodo de ejecución del Programa.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Valor de las ventas por empleado en las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado	Porcentaje	0.00	2011	P	10.00			10.00
					P(a)	10.00		10.00	10.00
					A				

**Details**

**Means of verification:** Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado	%	0.00	2011	P	10.00			10.00
					P(a)	10.00		10.00	10.00
					A				

**Details**

**Means of verification:** Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Desarrollo de un mecanismo de producción y difusión de innovaciones y de articulación entre los actores (empresas, instituciones relacionadas, etc.) de los APLs participantes, apoyado.

**Observation:** Cada uno de los indicadores siguientes está referido a un impacto específico y único a lograr por el programa, y no está referido a una acción particular. Por diseño, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo, la línea de base se mide en cad

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Número de empresas que manifiestan haber realizado actividades innovadoras o introducido nuevos productos y/o procesos en el mercado incrementado.	%	0.00	2011	P		25.00			25.00
					P(a)		25.00		15.00	15.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Número de consorcios, asociaciones, etc., entre las empresas del APL, y entre éstas y otros actores de la cadena productiva incrementado	%	0.00	2011	P	15.00	15.00			30.00
					P(a)	15.00	15.00		15.00	15.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Número de entidades de apoyo relacionadas (universidades, centros de investigación, etc.) que participan en acciones para el desarrollo elevado.	%	0.00	2011	P	10.00	10.00			20.00
					P(a)	10.00	10.00		10.00	10.00
					A	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Componente 1: Desarrollo de un Modelo Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los APLs.**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
1.1	Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Sistema	P	1	1,000,000
			P(a)	1	1,000,000
			A	1	607,611.04

**Component Nbr. 2 Componente 2: Cofinanciamiento de acciones específicas de los PMCs de APLs**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
2.1	Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	APL	P	0	12,125,000
			P(a)	4	12,125,000
			A	4	8,116,563.01

**Component Nbr. 3 Componente 3: Aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los APLs**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
3.1	Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 4 APLs desarrollado e implementado.	Sistema	P	1	1,280,000
			P(a)	1	1,280,000
			A	1	0

**Component Nbr. 4 Componente 4: Desarrollo e implementación de un sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas.**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
4.1	Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Sistema	P	1	380,000
			P(a)	1	255,000
			A	1	380,000

**Other Cost**

Gestión y administración del Programa.	P		1,053,000
	P(a)		2,502,326.34
	A		2,661,384.32

**Total Cost**

Total Cost	P		15,838,000
	P(a)		17,162,326.34
	A		11,765,558.37

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
