

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1188	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	04/15/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	Loan Number	4449/BL-HO, 4449/BL-HO-1, 4449/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARIA DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-SEC - EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Team Leader	FERNANDEZ COTO, RAQUEL AUXILIADORA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	7,000,000	11.67%	53,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	7,000,000	11.67%	53,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

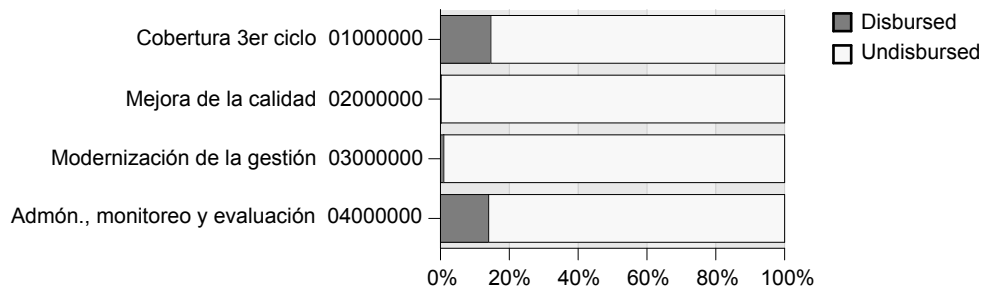

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023	
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228.00	2015	P	250.00		250.00
					P(a)	250.00		250.00
					A			

Details

Means of verification: Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023	
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua	Promedio	277.00	2015	P	304.00		304.00
					P(a)	304.00		304.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de línea base e informe final de consultoría

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023	
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	9.00	2014	P	7.00		7.00
					P(a)	7.00		7.00
					A			

Details

Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Componente 2. Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	45.00	2014	P	55.00		55.00
					P(a)	55.00		55.00
					A			
Details								
Means of verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), SEDUC								
Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	Students (#)	0.00	2014	P	11,200.00	12,200.00	14,200.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00
					P(a)	11,200.00	12,200.00	14,200.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00
					A	11,250.00					

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
	Girls			P	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
				P(a)	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
				A	5,718.00					0.00
	Boys			P	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
				P(a)	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
				A	5,532.00					0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 1: Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje

Observation: La consultoría se financiará con el Componente 2. Instrumento CLASS está basado en observación de aula y será adaptado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0.00	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00					

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	Students (#)	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mayor progresión escolar

Observation: Todos los estudiantes del Componente 2.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/INE)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLÉN y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: SEDUC. Documentos de programación aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1 Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios /contratos	P	1	2	4,000,000	16,179,999.45
		P(a)	1	2	4,000,000	15,772,128.45
		A	1	0	4,047,029	4,063,286.45
1.2 Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	0	50	50,000	5,820,000
		P(a)	0	50	50,000	6,227,873
		A	0	0	10,873	10,873

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1 Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía	Currículo	P	0	1	66,000	2,318,000
		P(a)	0	1	66,000	550,260
		A	0	0	0	0
2.2 Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	0	2,708	0	3,999,999
		P(a)	0	2,708	0	8,193,521.81
		A	0	0	219,273.81	219,273.81
2.3 Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	0	1	0	2,650,600
		P(a)	0	1	0	2,500,000
		A	0	0	0	0
2.4 Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	0	547	5,000	5,019,939
		P(a)	0	547	5,000	5,226,797
		A	0	0	0	0
2.5 Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jóvenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	# escuelas	P	0	80	93,500	2,324,500
		P(a)	0	80	93,500	2,033,000
		A	0	0	0	0
2.6 Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	0	1	15,000	2,000,000
		P(a)	0	1	15,000	1,765,000
		A	0	0	0	0
2.7 Evaluación de competencias finalizadas.	Evaluación	P	0	8	0	2,510,961
		P(a)	0	8	0	2,643,422.15
		A	0	0	47,349.52	62,288.15
2.8 Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	0	1	14,500	1,200,000
		P(a)	0	1	14,500	1,502,000
		A	0	0	0	0
2.9 Numero de jóvenes beneficiados por proyectos de formación para el empleo y emprendimiento	# de jóvenes	P	0	3,000	30,000	4,976,000
		P(a)	0	3,000	30,000	2,586,000
		A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	0	1	25,000	3,341,958
			P(a)	0	1	25,000	3,939,860
			A	0	0	5,880	5,880
3.2	Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	0	1	60,000	660,000
			P(a)	0	1	60,000	400,000
			A	0	0	0	0
3.3	Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	0	4	50,000	602,400
			P(a)	0	4	50,000	602,400
			A	0	0	0	0
3.4	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	4	4	225,000	2,595,642
			P(a)	4	4	225,000	2,257,739.15
			A	1	0	86,628.7	102,886.15

Other Cost

Personal de la Unidad Ejecutora	P			336,655	2,593,130.55
	P(a)			336,655	1,692,648.85
	A			383,374.21	455,348.85
Equipamiento de la Unidad y gastos administrativos	P			127,000	768,600
	P(a)			127,000	831,277.49
	A			121,401.49	121,401.49
Auditoría	P			0	250,000
	P(a)			0	248,043.92
	A			49,612.92	49,612.92
Informes de medio término y final, incluyendo el PCR	P			0	180,000
	P(a)			0	15,000
	A			0	0
Imprevistos	P				8,271
	P(a)				1,013,028.18
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			5,097,655	60,000,000
	P(a)			5,097,655	60,000,000
	A			4,971,422.65	5,090,850.82

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	Se modificó el histórico de acuerdo al informe semestral enviado por la Unidad Ejecutora. Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
				Modify Financial Historical Actual	RAQUELF	03/10/2020
	Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	Se modificó el histórico de acuerdo al informe semestral enviado por la Unidad Ejecutora. Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
				Modify Financial Historical Actual	RAQUELF	03/10/2020
	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jóvenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Evaluación de competencias finalizadas.	Se modificó el histórico de acuerdo al informe semestral enviado por la Unidad Ejecutora. Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
				Modify Financial Historical Actual	RAQUELF	03/10/2020
	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
	Numero de jovenes beneficiados por proyectos de formación para el empleo y emprendimiento	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020
Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/20/2020	
Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de atraso a causa de la emergencia del coronavirus.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAQUELF	03/10/2020	
Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Se modificó la planificación financiera de acuerdo al PEP actual y considerando un ejercicio de simulación que contempla 4 meses de	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change	RAQUELF	03/10/2020	

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output		atraso a causa de la emergencia del coronavirus.		in the Financial P(a).		

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Intra/Inter Coordination

Legal aspects and public processes

Project Management Capacity
