

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1057	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/18
<b>Last Update</b>	03/26/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/21/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Production Development for International Integration	<b>Loan Number</b>	2583/OC-ES, 2583/OC-ES-1, 2583/OC-ES-2, 2583/OC-ES-3
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA	<b>Sector/Subsector</b>	TD - TRADE
<b>Team Leader</b>	GRANADOS, JAIME	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1057	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	26,634,810.65	88.78%	3,365,189.35
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	26,634,810.65	88.78%	3,365,189.35

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

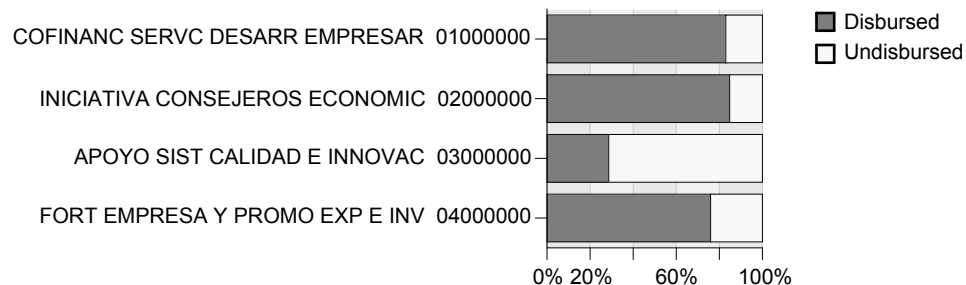

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Se aumentará el ritmo de crecimiento anual de las exportaciones salvadoreñas.

**Observation:** Se espera que las exportaciones hayan crecido un 35% al final del periodo de ejecución, con respecto al año 2009.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Rtmo de crecimiento anual de las exportaciones.	Porcentaje	2.70	2009	P		6.20
					P(a)		6.20
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas de exportaciones del Banco Central de Reservas.

**Observations:** La línea de base es el promedio de los 2005-2009: 2.7%. La meta esperada será el promedio de los años de ejecución: 2,2% (2011-2015).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Base exportable, oferta exportable y mercados de destino de El Salvador incrementados.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Empresas que exportan más de US\$ 500.000 al año.	Empresa	394.00	2009	P			540.00
					P(a)			540.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros del Banco Central de Reservas, MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Productos exportados por valores superiores a los US\$ 500.000 al año.	Producto	466.00	2009	P			561.00
					P(a)			561.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas del MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Mercados de destino de exportaciones superiores a US\$ 500.000 al año.	Mercado	49.00	2009	P			60.00
					P(a)			60.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registol de control del MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.4	Tasa de crecimiento de exportación de las MIPYMES apoyadas por los co-financiamientos de SDE.	Porcentaje	10.00	2009	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

**Observations:** Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Promoción de exportaciones salvadoreñas aumentada gracias al fortalecimiento de la presencia institucional de El Salvador en los principales países socios comerciales.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
2.1	Consejeros Económicos y Comerciales establecidos en los destinos estratégicos.	Funcionario	0.00	2009	P			12.00
					P(a)			12.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Contratos de los consultores consejeros, plan de trabajo y resultados reportados en el sistema de Balanced Scorecard.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Aumento de la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
3.1	Cambio en la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.	Porcentaje de disposición favorable	0.00	2009	P			1.00
					P(a)			1.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y/o entrevistas/opinión de expertos

**Observations:** Empresarios están dispuestos a participar en temas de innovación y calidad, incluyendo a las grandes empresas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** Capacidad institucional para el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo exportador aumentada.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
4.1	Procesos de desarrollo de exportaciones e inversiones diseñados e implementados: 1) campaña de imagen-país; 2) establecimiento de un programa de gestores de inversión; 3) uso de herramientas para el desarrollo de sectores de exportación; y 4) promoción de	Proceso	0.00	2009	P			4.00
					P(a)			4.00
					A			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informes de las cuatro consultorías y sus respectivos resultados.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr.** 5: Capacidad analítica y de ejecución de la política comercial nacional y la administración de tratados comerciales aumentada.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
5.1	Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.	Puntos	528.00	2009	P			681.00
					P(a)			681.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta a las diferentes agencias de administración de acuerdos comerciales

**Observations:** La línea de base se mejorará en un 29% para alcanzar 681 puntos en el Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 I. Cofinanciamiento de servicios de desarrollo empresarial (SDE) para MIPYMES**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Estrategia de comunicación para dar a conocer las líneas de apoyo de co-financiamientos de SDE implementada.	Estrategia	P		1	2,000	184,000
			P(a)	1	1	64,180.54	155,759.82
			A	1	1	29,987.14	149,784.82
1.2	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Professionals (#)	P		20		53,000
			P(a)	0	194	9,608.44	50,710.72
			A	47	194	8,587.58	49,200.79
1.3	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Adecuación	P		2		60,000
			P(a)	1	4	19,000	19,500
			A	1	3	2,600	9,000
1.4	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Empresa	P	20	200	269,000	10,087,000
			P(a)	0	394	2,032,495.99	8,966,234.56
			A	35	372	1,411,174.65	8,730,946.76
1.5	Unidad equipada y fortalecida	Unidad	P	1	1		116,000
			P(a)	1	1	74,717.48	491,096.42
			A	1	1	67,919.77	481,334.32

**Component Nbr. 2 II. Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales (CEC).**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Aplicación informática de monitoreo y seguimiento funcionando	Aplicación	P		1		107,000
			P(a)	0	1	37,800	127,466.71
			A	0	1	29,639.12	127,466.71
2.2	Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales en operación.	Iniciativa	P	1	1	265,000	3,686,000
			P(a)	0	1	982,248.77	2,815,087.28
			A	0	1	539,963.64	2,815,087.28
2.3	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Evaluación	P		1		16,000
			P(a)	1	0	15,000	0
			A	0	0	0	0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 III. Apoyo a la Calidad e Innovación Tecnológica**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1 Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	Obra	P		1		1,863,000
		P(a)	1	1	3,106,609.98	4,732,636.73
		A	0	0	1,326,389.44	1,503,002.04
3.2 Estrategia de promoción y comunicación del SSC desarrollada	Estrategia	P	1	1	44,000	297,000
		P(a)	1	1	53,559.25	137,418.78
		A	1	1	14,539.67	137,418.78
3.3 Metodología de procesos de normalización desarrollada	Metodología	P	1	1	7,000	440,000
		P(a)	1	1	228,480.28	425,702.2
		A	1	1	159,615.9	425,702.2
3.4 Organismo de Acreditación fortalecido	Organismo fortalecido	P	1	1	69,000	295,000
		P(a)	1	1	49,395.34	223,813.19
		A	1	1	38,194.49	223,813.19
3.5 Equipo de calibraciones y comparaciones de patrones de trabajo con patrones industriales del CIM funcionando	Equipo	P	1	1	9,000	70,000
		P(a)	0	1	0	73,812.03
		A	0	1	0	73,812.03
3.6 Talleres de capacitación para organismos de inspección y verificación de calidad impartidos	Taller	P	1	6	8,000	59,000
		P(a)	0	26	1,057.84	56,326.3
		A	0	26	1,057.84	56,326.3
3.7 Sistema de divulgación de reglamentos técnicos implementado	Sistema diseñado	P		1		10,000
		P(a)	0	1	0	0
		A	0	1	0	0
3.8 Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	Sistema	P		1		400,000
		P(a)	0	1	93,863.42	598,011.57
		A	0	1	137,874.99	598,011.57
3.9 Unidad CNC equipada y fortalecida	Unidad	P	1	1	20,000	416,000
		P(a)	0	1	0	107,244.83
		A	0	0	0	107,244.83

**Component Nbr. 4 IV. Fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones e inversiones.**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1 Estrategia de imagen-país implementada	Estrategia	P		1	38,000	1,750,000
		P(a)	1	1	2,003,094	2,026,414.17
		A	0	0	718,998.73	804,183.44
4.2 Programa de Gestores de Inversión en operación.	Programa	P	1	1	172,000	1,950,000
		P(a)	0	1	756,676.88	1,940,278.01
		A	0	1	623,937.95	1,787,695.47
4.3 Programa de Cultura Exportadora en marcha	Programa	P	1	1	168,000	1,380,000
		P(a)	0	1	128,782.67	814,204.58
		A	0	1	103,958.68	814,204.58
4.4 Nuevas empresas exportando	Empresa	P	5	17	394,000	1,997,000
		P(a)	3	20	604,451.39	1,679,306.25
		A	6	20	534,393.31	1,656,906.26

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 V. Apoyo a la formulación de Política Comercial y Administración de Tratados Comerciales.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
5.1 Funcionarios públicos capacitados en los cinco módulos del programa de política comercial	Professionals (#)	P		90		102,000
		P(a)	0	131	0	21,648.35
		A	0	131	0	21,648.35
5.2 Programa de Divulgación de los Acuerdos Comerciales implementado.	Programa	P	1	1		308,000
		P(a)	1	1	47,445.58	432,715.85
		A	1	1	35,431.58	424,566.35
5.3 Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Sistema	P	1	1		252,000
		P(a)	0	1	15,466.66	268,298.17
		A	0	1	26,733.52	268,298.17
5.4 Capacidad de análisis económico de los técnicos y gerentes de la UIE desarrollada	Capacidad desarrollada	P	1	1		94,000
		P(a)	0	1	5,835.63	61,707.54
		A	0	1	5,699.1	61,407.54
5.5 Política Comercial de El Salvador Elaborada	Informe	P		2		20,000
		P(a)	0	1	0	33,000
		A	0	1	0	33,000
5.6 Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Professionals (#)	P	60	180		205,000
		P(a)	0	248	7,036	60,384.57
		A	0	248	6,054.99	60,384.57
5.7 Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de defensa comercial realizado	Plan	P	1	1		164,000
		P(a)	1	0	29,110	66,689.56
		A	0	0	1,593.8	66,689.56
5.8 Aplicación informática para la maximización de bases de datos y elaboración de informes de coyuntura funcionando	Aplicación	P		1		61,000
		P(a)	0	1	0	32,395.04
		A	0	1	0	32,395.04
5.9 Proyecto de Ley de Defensa Comercial y su respectivo Reglamento	Proyecto de Ley	P	1	1		101,000
		P(a)	0.5	1	20,000	47,255.49
		A	0.5	1	20,000	47,255.49
5.10 Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Aplicación	P	1	4		239,000
		P(a)	4	0	103,425	48,591.5
		A	0	0	3,125	48,591.5
5.11 Unidad de DATCO equipada y fortalecida	Unidad	P	1	1	4,000	77,000
		P(a)	0	1	43,156.25	284,018.87
		A	0	1	78,785.58	284,018.87
5.12 Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Professionals (#)	P		75		51,000
		P(a)	0	123	9,306.25	11,285.26
		A	0	123	0	11,285.26
5.13 Metodologías sobre análisis de impacto económico diseñadas	Metodología	P		2		23,000
		P(a)	2	3	10,000	0
		A	3	3	0	0
5.14 Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Estudios	P		40		169,000
		P(a)	0	43	4,180.62	228,220.58
		A	0	43	3,731.5	228,220.58

Other Cost



Gestión, Administración y Otros	P			6,000	134,000
	P(a)			71,765.88	270,956.02
	A			52,009.07	196,136.55
Evaluaciones	P			45,000	165,000
	P(a)			80,000	117,351.96
	A			4,000	41,351.96
Auditorías	P			50,000	200,000
	P(a)			40,000	104,365.42
	A			32,972.95	55,898.37
Contingencias	P			180,000	654,000
	P(a)			280,650	30,750
	A			0	0
Unidad Ejecutora funcionando	P			214,000	1,357,000
	P(a)			265,200	1,296,481.58
	A			263,103.22	1,092,784.83

### Total Cost

Total Cost	P			2,158,000	30,000,000
	P(a)			11,293,600.14	29,020,279.91
	A			6,282,073.21	23,525,074.36

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Aplicación informática de monitoreo y seguimiento funcionando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Estrategia de comunicación para dar a conocer las líneas de apoyo de co-financiamientos de SDE implementada.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Estrategia de imagen-país implementada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales en operación.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Nuevas empresas exportando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Programa de Cultura Exportadora en marcha	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Programa de Divulgación de los Acuerdos Comerciales implementado.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Programa de Gestores de Inversión en operación.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Unidad equipada y fortalecida	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Capacidad de análisis económico de los técnicos y gerentes de la UIE desarrollada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Programa de Gestores de Inversión en operación.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/12/2018	12/22/2017
Output	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Nuevas empresas exportando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de	Modify	Acuerdos tomados en reunión de fin de año	03/14/2018	12/22/2017

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	defensa comercial realizado	Output	de estado del proyecto en diciembre/2017		
Output	Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Estrategia de promoción y comunicación del SSC desarrollada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Metodología de procesos de normalización desarrollada	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Organismo de Acreditación fortalecido	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Metologías sobre análisis de impacto económico diseñadas	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de defensa comercial realizado	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
Output	Unidad de DATCO equipada y fortalecida	Modify Output	Acuerdos tomados en reunión de fin de año de estado del proyecto en diciembre/2017	03/14/2018	12/22/2017
