

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1057	Chief of Operations Validation Date	04/05/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/03/19
Last Update	04/05/19	Country Representative Validation Date	05/09/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Production Development for International Integration	Loan Number	2583/OC-ES, 2583/OC-ES-1, 2583/OC-ES-2, 2583/OC-ES-3
Executing Agency	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	TD - TRADE
Team Leader	LIBBY HERNANDEZ, MARGARITA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1057	30,000,000	29,460,215.23	0	0	30,000,000	29,460,215.23	29,460,215.23	100.00%	0
Aggregated	30,000,000	29,460,215.23	0	0	30,000,000	29,460,215.23	29,460,215.23	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

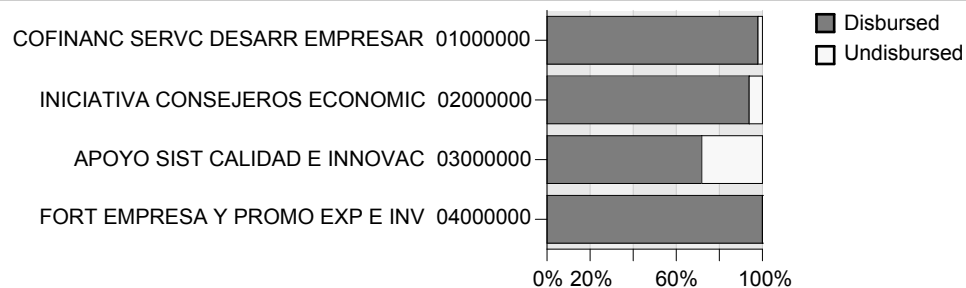

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Se aumentará el ritmo de crecimiento anual de las exportaciones salvadoreñas.

Observation: Se espera que las exportaciones hayan crecido un 35% al final del periodo de ejecución, con respecto al año 2009.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Rtmo de crecimiento anual de las exportaciones.	Porcentaje	2.70	2009	P		6.20
					P(a)		6.20
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas de exportaciones del Banco Central de Reservas.							
Observations: La línea de base es el promedio de los 2005-2009: 2.7%. La meta esperada será el promedio de los años de ejecución: 2,2% (2011-2015).							
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Base exportable, oferta exportable y mercados de destino de El Salvador incrementados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Empresas que exportan más de US\$ 500.000 al año.	Empresa	394.00	2009	P			540.00
					P(a)			540.00
					A			

Details

Means of verification: Registros del Banco Central de Reservas, MINEC.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Productos exportados por valores superiores a los US\$ 500.000 al año.	Producto	466.00	2009	P			561.00
					P(a)			561.00
					A			

Details

Means of verification: Estadísticas del MINEC.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Mercados de destino de exportaciones superiores a US\$ 500.000 al año.	Mercado	49.00	2009	P			60.00
					P(a)			60.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de control del MINEC.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.4	Tasa de crecimiento de exportación de las MIPYMES apoyadas por los co-financiamientos de SDE.	Porcentaje	10.00	2009	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

Observations: Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Promoción de exportaciones salvadoreñas aumentada gracias al fortalecimiento de la presencia institucional de El Salvador en los principales países socios comerciales.

Observation:

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
2.1	Consejeros Económicos y Comerciales establecidos en los destinos estratégicos.	Funcionario	0.00	2009	P			12.00
					P(a)			12.00
					A			

Details

Means of verification: Contratos de los consultores consejeros, plan de trabajo y resultados reportados en el sistema de Balanced Scorecard.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Aumento de la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.

Observation:

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
3.1	Cambio en la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.	Porcentaje de disposición favorable	0.00	2009	P			1.00
					P(a)			1.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta y/o entrevistas/opinión de expertos

Observations: Empresarios están dispuestos a participar en temas de innovación y calidad, incluyendo a las grandes empresas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Capacidad institucional para el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo exportador aumentada.

Observation:

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
4.1	Procesos de desarrollo de exportaciones e inversiones diseñados e implementados: 1) campaña de imagen-país; 2) establecimiento de un programa de gestores de inversión; 3) uso de herramientas para el desarrollo de sectores de exportación; y 4) promoción de	Proceso	0.00	2009	P			4.00
					P(a)			4.00
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes de las cuatro consultorías y sus respectivos resultados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: Capacidad analítica y de ejecución de la política comercial nacional y la administración de tratados comerciales aumentada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
5.1	Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.	Puntos	528.00	2009	P			681.00
					P(a)			681.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta a las diferentes agencias de administración de acuerdos comerciales

Observations: La línea de base se mejorará en un 29% para alcanzar 681 puntos en el Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Cofinanciamiento de servicios de desarrollo empresarial (SDE) para MIPYMES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Estrategia de comunicación para dar a conocer las líneas de apoyo de co-financiamientos de SDE implementada.	Estrategia	P		1		184,000
			P(a)	0	1	5,975	317,793.82
			A	0	1	5,975	155,759.82
1.2	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Professionals (#)	P		20		53,000
			P(a)	0	194	1,509.93	50,710.72
			A	0	194	1,509.93	50,710.72
1.3	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Adecuación	P		2		60,000
			P(a)	1	4	10,500	19,500
			A	1	4	12,868.78	21,868.78
1.4	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Empresa	P		200		10,087,000
			P(a)	22	394	235,287.8	8,966,234.56
			A	16	388	173,263.68	8,904,210.44
1.5	Unidad equipada y fortalecida	Unidad	P		1		116,000
			P(a)	0	1	9,762.1	491,096.42
			A	0	1	9,762.1	491,096.42

Component Nbr. 2 II. Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales (CEC).

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Aplicación informática de monitoreo y seguimiento funcionando	Aplicación	P		1		107,000
			P(a)	0	1	0	127,466.71
			A	0	1	0	127,466.71
2.2	Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales en operación.	Iniciativa	P		1		3,686,000
			P(a)	0	1	0	2,815,087.28
			A	0	1	0	2,815,087.28
2.3	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Evaluación	P		1		16,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III. Apoyo a la Calidad e Innovación Tecnológica

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1 Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	Obra	P		1		1,863,000
		P(a)	1	1	3,229,634.69	5,131,699.45
		A	0	0	2,269,747.47	3,772,749.51
3.2 Estrategia de promoción y comunicación del SSC desarrollada	Estrategia	P		1		297,000
		P(a)	0	1	0	137,418.78
		A	0	1	0	137,418.78
3.3 Metodología de procesos de normalización desarrollada	Metodología	P		1		440,000
		P(a)	0	1	0	425,702.2
		A	0	1	0	425,702.2
3.4 Organismo de Acreditación fortalecido	Organismo fortalecido	P		1		295,000
		P(a)	0	1	0	223,813.19
		A	0	1	0	223,813.19
3.5 Equipo de calibraciones y comparaciones de patrones de trabajo con patrones industriales del CIM funcionando	Equipo	P		1		70,000
		P(a)	0	1	0	73,812.03
		A	0	1	0	73,812.03
3.6 Talleres de capacitación para organismos de inspección y verificación de calidad impartidos	Taller	P		6		59,000
		P(a)	0	26	0	56,326.3
		A	0	26	0	56,326.3
3.7 Sistema de divulgación de reglamentos técnicos implementado	Sistema diseñado	P		1		10,000
		P(a)	0	1	0	0
		A	0	1	0	0
3.8 Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	Sistema	P		1		400,000
		P(a)	0	1	0	613,011.57
		A	0	1	0	598,011.57
3.9 Unidad CNC equipada y fortalecida	Unidad	P		1		416,000
		P(a)	1	1	0	107,244.83
		A	0	0	0	107,244.83

Component Nbr. 4 IV. Fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones e inversiones.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
4.1 Estrategia de imagen-país implementada	Estrategia	P		1		1,750,000
		P(a)	1	1	1,222,230.73	2,026,414.17
		A	1	1	1,243,003.02	2,047,186.46
4.2 Programa de Gestores de Inversión en operación.	Programa	P		1		1,950,000
		P(a)	0	1	152,582.54	1,940,278.01
		A	0	1	152,582.54	1,940,278.01
4.3 Programa de Cultura Exportadora en marcha	Programa	P		1		1,380,000
		P(a)	0	1	0	814,204.58
		A	0	1	0	814,204.58
4.4 Nuevas empresas exportando	Empresa	P		17		1,997,000
		P(a)	0	20	22,399.99	1,679,306.25
		A	0	20	22,399.99	1,679,306.25

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 V. Apoyo a la formulación de Política Comercial y Administración de Tratados Comerciales.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
5.1 Funcionarios públicos capacitados en los cinco módulos del programa de política comercial	Professionals (#)	P		90		102,000
		P(a)	0	131	0	21,648.35
		A	0	131	0	21,648.35
5.2 Programa de Divulgación de los Acuerdos Comerciales implementado.	Programa	P		1		308,000
		P(a)		1	8,149.5	432,715.85
		A	0	1	8,149.5	432,715.85
5.3 Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Sistema	P		1		252,000
		P(a)	0	1	0	268,298.17
		A	0	1	0	268,298.17
5.4 Capacidad de análisis económico de los técnicos y gerentes de la UIE desarrollada	Capacidad desarrollada	P		1		94,000
		P(a)	0	1	300	61,707.54
		A	0	1	550	61,957.54
5.5 Política Comercial de El Salvador Elaborada	Informe	P		2		20,000
		P(a)	0	1	0	33,000
		A	0	1	0	33,000
5.6 Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Professionals (#)	P		180		205,000
		P(a)	0	248	0	60,384.57
		A	0	248	0	60,384.57
5.7 Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de defensa comercial realizado	Plan	P		1		164,000
		P(a)	0	0	0	66,689.56
		A	0	0	0	66,689.56
5.8 Aplicación informática para la maximización de bases de datos y elaboración de informes de coyuntura funcionando	Aplicación	P		1		61,000
		P(a)	0	1	0	32,395.04
		A	0	1	0	32,395.04
5.9 Proyecto de Ley de Defensa Comercial y su respectivo Reglamento	Proyecto de Ley	P		1		101,000
		P(a)	0	1	0	47,255.49
		A	0	1	0	47,255.49
5.10 Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Aplicación	P		4		239,000
		P(a)	0	0	0	48,591.5
		A	0	0	0	48,591.5
5.11 Unidad de DATCO equipada y fortalecida	Unidad	P		1		77,000
		P(a)	0	1	0	284,018.87
		A	0	1	0	284,018.87
5.12 Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Professionals (#)	P		75		51,000
		P(a)	0	123	0	11,285.26
		A	0	123	0	11,285.26
5.13 Metodologías sobre análisis de impacto económico diseñadas	Metodología	P		2		23,000
		P(a)	0	3	0	0
		A	0	3	0	0
5.14 Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Estudios	P		40		169,000
		P(a)	0	43	0	228,220.58
		A	0	43	0	228,220.58

Other Cost

Gestión, Administración y Otros	P			134,000
	P(a)		74,819.47	231,299.28
	A		33,043.94	229,180.49
Evaluaciones	P			165,000
	P(a)		76,000	264,273.76
	A		49,819.36	91,171.32
Auditorías	P			200,000
	P(a)		48,467.05	104,365.42
	A		38,282.59	94,180.96
Contingencias	P			654,000
	P(a)		30,750	13,797.3
	A		0	0
Unidad Ejecutora funcionando	P			1,357,000
	P(a)		203,696.75	1,296,481.58
	A		217,130.1	1,309,914.93

Total Cost

Total Cost	P			30,000,000
	P(a)		5,332,065.55	29,686,688.99
	A		4,238,088	27,763,162.36

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estrategia de comunicación para dar a conocer las líneas de apoyo de co-financiamientos de SDE implementada.	De acuerdo a informe semestral del segundo periodo 2018 y reuniones de seguimiento.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	EMERITAB	03/13/2019
	Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	De acuerdo a informe semestral del segundo periodo 2018 y reuniones de seguimiento.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	EMERITAB	03/13/2019
	Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	De acuerdo a informe semestral del segundo periodo 2018 y reuniones de seguimiento.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	EMERITAB	03/13/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions
