

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1227	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Multiphase Program to Improve Quality in the Delivery of Social Services - Phase I	Loan Number	4364/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Team Leader	MEJIA GIRALDO, CAMILA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1227	237,600,000	237,600,000	9,392,841	0	246,992,841	237,600,000	190,000,000	79.97%	47,600,000
Aggregated	237,600,000	237,600,000	9,392,841	0	246,992,841	237,600,000	190,000,000	79.97%	47,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

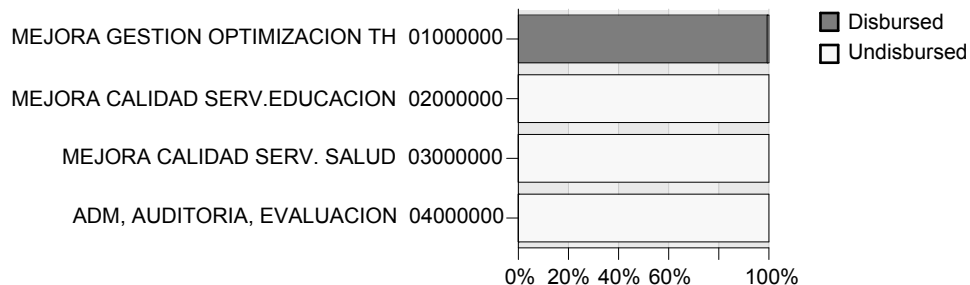

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Calidad en la prestación de servicios educativos y de salud mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	I.1.1. Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de aprendizaje "suficiente" en 4to. grado de EGB en Lenguaje y Literatura	puntos porcentuales (sin dimensión)	75.20	2016	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de la prueba Ser Estudiante INEVAL

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	I.1.2. Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de aprendizaje "suficiente" en 4to. grado de EGB en Matemática	puntos porcentuales (sin dimensión)	78.40	2016	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de la prueba Ser Estudiante INEVAL

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	I.2. Mortalidad materna	tasa	44.60	2015	P		40.40
					P(a)		40.40
					A		

Details

Means of verification: Estadísticas vitales INEC

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	I.3. Mortalidad neonatal	tasa	3.80	2014	P		3.50

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	I.3. Mortalidad neonatal	tasa	3.80	2014	P(a)		3.50
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas vitales INEC							
Observations: Ver PME							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión Mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Expedientes de desvinculación devengados/Expedientes de desvinculación ingresados	%	0.00	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
					P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
					A	25.00	25.00			

Details

Means of verification: Informe MdT

Observations: Un expediente se considera devengado cuando ha sido pagado Un expediente ingresado representa a un empleado público que ha cumplido con las condiciones mínimas de retiro y completa el proceso de solicitud al Ministerio del Trabajo. El denominador en línea de base es de 15,413 expedientes ingresados hasta junio 2017. Se devengarían 3,865 con el programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	agencias	0.00	2017	P	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					P(a)	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Reportes DNTIC de MINEDUC y MSP

Observations: Se financiará la introducción de TIC en áreas de provisión de servicios en ambos Ministerios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Talento humano optimizado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Docentes que tienen nivel "excelente" o "favorable" en las pruebas estandarizadas "Ser Maestro"	%	29.20	2016	P	29.20	29.20	33.00	33.00	33.00
					P(a)	29.20	29.20	33.00	33.00	33.00
					A					

Details

Means of verification: Informe evaluación "Ser Maestro", INEVAL

Observations: INEVAL realiza pruebas de niveles de desempeño de maestros clasificándolos en excelente, favorable, fundamental y en formación

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Profesionales de atención primaria en el total de la fuerza laboral en servicios de salud	%	59.00	2018	P	60.00	61.00	62.00	62.00	62.00
					P(a)	60.00	61.00	62.00	62.00	62.00
					A	59.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de la Dirección Nacional de Talento Humano del MSP

Observations: Fuente: Distributivo de personal *Se actualizó el indicador en base al distributivo de personal de la Dirección de talento humano. En el año 2018, se contrataron alrededor de 1.000 TAPS y se reagruparon los profesionales de salud en base a la cartera de servicios.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios en el sector educación mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Docentes capacitados	Teachers (#)	0.00	2017	P	0.00	0.00	12,538.00	12,538.00	12,538.00
					P(a)	0.00	0.00	12,538.00	12,538.00	12,538.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Subsecretaria de Desarrollo Profesional del MINEDUC

Observations: Docentes beneficiados con programas de capacitación del Componente 2.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Estudiantes beneficiados por la capacitación docente	estudiantes	0.00	2017	P	0.00	0.00	376,140.00	376,140.00	376,140.00
					P(a)	0.00	0.00	376,140.00	376,140.00	376,140.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de Subsecretaria de Desarrollo Profesional del MINEDUC

Observations: Estudiantes beneficiados por los docentes que reciben capacitación en el componente 2. Se benefician 30 estudiantes por cada docente capacitado. (indicador Corporativo BID)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Calidad de los servicios en el sector salud mejorada

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Pacientes que cuentan con un registro médico electrónico	pacientes	1,500,000.00	2017	P	1,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
					P(a)	1,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
					A	3,894,746.00	3,894,746.00			

Details

Means of verification: Informe de la Dirección Nacional de TIC del MSP

Observations: Resultado de los productos de equipamiento para la digitalización, red inicial de conectividad y data center alterno, incluyendo servicios de gasto corriente de internet a financiarse fuera de esta operación y la ampliación del sistema informático PRAS financiado fuera de la operación. El indicador se refiere a los registros en el sistema PRAS (Plataforma de Registro de Atención en Salud) vigente en el MSP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Componentes sanguíneos disponibles mensualmente en la red pública integral de salud	componentes	14,159.00	2017	P	14,159.00	14,159.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
					P(a)	14,159.00	14,159.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
					A	14,159.00	14,159.00			

Details

Means of verification: Informe del Programa Nacional de sangre del MSP

Observations: Resultado del Hemocentro Nacional instalado a finales del Año 3. Una donación de sangre provee aprox. 2,5 componentes sanguíneos (plasma, glóbulos rojos y blancos). El indicador excluye los componentes sanguíneos producidos en los bancos de sangre intrahospitalarios de la red pública integral. *La meta del Año 3 y final disminuyen en virtud que para la fecha de finalización del proyecto, el Hemocentro estaría iniciando su producción y hasta alcanzar su producción óptima todavía dependería de la Cruz Roja Ecuatoriana

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.2	Profesionales de salud con certificación de conocimiento adquirido sobre el total de los inscritos en las capacitaciones	%	0.00	2017	P	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de la Dirección Nacional de Normalización de Talento Humano del MSP con listas de participantes y certificados emitidos

Observations: Resultado de las capacitaciones para la mejora de talento humano. Se basa en el número de profesionales de salud beneficiados por el plan de mejora de talento humano Componente 3 que asistieron y pasaron la evaluación final de las capacitaciones

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 MEJORA DE LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL TH

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC	personas	P	0	2,503	0	113,712,047.27
			P(a)	0	2,503	0	113,712,047.27
			A	0	2,503	0	113,712,047.27
1.2	Personal con beneficios por desvinculación devengados en MSP	personas	P	0	1,362	0	76,287,952.73
			P(a)	0	1,362	0	76,287,952.73
			A	0	1,362	0	76,287,952.73
1.3	Documento de plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado	documento	P	0	1	0	280,000
			P(a)	0	1	0	280,000
			A	0	0	0	0
1.4	Documento de plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado	documento	P	0	1	0	280,000
			P(a)	0	1	0	280,000
			A	0	0	0	0
1.5	Estudio de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos por concepto de desvinculación, aprobado	estudio	P	1	1	112,000	224,000
			P(a)	1	1	112,000	224,000
			A	0	0	0	0
1.6	Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH	informes	P	2	4	100,000	627,200.01
			P(a)	2	4	100,000	627,200.01
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR EDUCACION

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Sistema de Gestión Docente operando	sistema	P	0	1	0	1,680,000
			P(a)	0	1	0	1,680,000
			A	0	0	0	0
2.2	Infraestructura Tecnológica para los Servicios de Gestión Docente y el apoyo a la Comunidad Educativa en Línea, adquirida	equipos informáticos	P	0	12,900	0	11,463,200
			P(a)	0	12,900	0	11,463,200
			A	0	0	0	0
2.3	Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados	programas	P	0	4	0	9,779,000
			P(a)	0	4	0	9,779,000
			A	0	0	0	0
2.4	Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico, operando	equipos de talleres	P	0	33	0	1,664,320.98
			P(a)	0	33	0	1,664,320.98
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR SALUD

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1 Reportes de Modelo de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados	reportes	P	0	4	0	692,160
		P(a)	0	4	0	692,160
		A	0	0	0	0
3.2 Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado	equipos	P	0	7,000	0	7,587,414
		P(a)	0	7,000	0	7,587,414
		A	0	0	0	0
3.3 Hemocentro nacional instalado	centro	P	0	1	0	10,241,595.34
		P(a)	0	1	0	10,241,595.34
		A	0	0	0	0
3.4 Capacitaciones para la mejora de TH implementadas	capacitaciones	P	0	3	0	1,545,600
		P(a)	0	3	0	1,545,600
		A	0	0	0	0
3.5 Puestos de neonatología repotenciados y funcionando	puestos	P	0	31	0	4,987,045.28
		P(a)	0	31	0	4,987,045.28
		A	0	0	0	0
3.6 Servicio de Centro alterno de datos instalado	servicio	P	0	1	0	1,642,600
		P(a)	0	1	0	1,642,600
		A	0	0	0	0
3.7 Red de conectividad inicial instalada	red	P	0	1	0	2,038,243
		P(a)	0	1	0	2,038,243
		A	0	0	0	0
3.8 Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud elaborados	informes	P	2	6	117,698	706,186.24
		P(a)	2	6	117,698	706,186.24
		A	0	0	0	0

Other Cost

Auditorías	P			67,200	212,800
	P(a)			67,200	212,800
	A			0	0
Evaluación y Monitoreo	P			33,600	168,000.15
	P(a)			33,600	168,000.15
	A			0	0
Imprevistos	P			0	1,173,476
	P(a)			0	1,173,476
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			430,498	246,992,841
	P(a)			430,498	246,992,841
	A			0	190,000,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Profesionales de atención primaria en el total de la fuerza laboral en servicios de salud	El ejecutor reportó la meta A 2018 del outcome recién en este ciclo de reporte. Se procedió a ingresar el dato obtenido.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	JBRITOVERA	09/30/2019
Outcome indicator	Docentes que tienen nivel "excelente" o "favorable" en las pruebas estandarizadas "Ser Maestro"		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	ETOBAR	10/03/2019
	Profesionales de atención primaria en el total de la fuerza laboral en servicios de salud	Se corrige en este periodo el campo de observaciones en la definición de este indicador, ya que en el contexto del taller de arranque fue ingresado una información errónea correspondiente a otro indicador. Además se corrigió el nombre de la entidad responsable de reporte al interior del MSP.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JBRITOVERA	09/30/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions
