

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1171	Chief of Operations Validation Date	04/08/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/07/21	Country Representative Validation Date	05/03/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improving Access to Civil Registry Services and Quality Identification at the National Level	Loan Number	4297/OC-PE
Executing Agency	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-CIVIL REGISTRIES
Team Leader	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1171	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	2,426,710	4.85%	47,573,290
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	2,426,710	4.85%	47,573,290

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

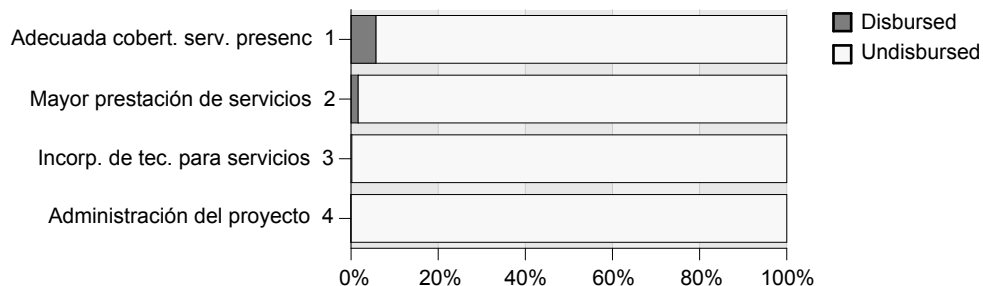

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Costo de transacción para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI) reducido

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Costo de transacción anual, unitario, derivado del cumplimiento de requisitos para inscripción y renovación del DNI	USD	9.37	2017	2023	P	6.31
						A	

Details

Means of verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Esta reducción de costos se debe a la implementación de la captura en vivo (enrolamiento). Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Costo de transacción anual, unitario, para la obtención de copia certificada para migrantes internos	USD	54.29	2017	2023	P	5.16
						A	

Details

Means of verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Los migrantes internos son el 20% de la población. Si su acta no está digitalizada, deben trasladarse a su municipio para obtenerla. La digitalización de actas elimina la necesidad de viajar. Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Calidad de los servicios de registro e identificación mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.0	Número de actas registrales con errores detectadas y corregidas	#	0.00	2019	P	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
					A						

Details

Means of verification: Registros administrativos de RENIEC

Observations: La detección de errores se dará como parte del proceso de digitalización y corrección de actas. De 63 millones de actas originalmente en papel, 14 millones ya han sido digitalizadas, habiéndose identificado una tasa de error de 7%. Se asume que esa tasa de error se va a mantener para la digitalización de los 14 millones bajo este proyecto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.1	Copias certificadas de actas registrales solicitadas vía web	#	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
					A						

Details

Means of verification: Registros administrativos de RENIEC y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Fuente: Estudio de preinversión SNIP, pág. 1254 (682 en el pdf).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Acceso a los servicios registrales y de identificación para los ciudadanos de las comunidades más aisladas mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.0	DNI emitidos a partir de actas bilingües	%	0.16	2017	P	0.16				0.54	0.54
					A						

Details

Means of verification: Registros administrativos de RENIEC

Observations: Porcentaje de los DNI emitidos a partir de acta bilingüe respecto al total de DNI (se asume 5,6 millones al año).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficiencia en la gestión de RENIEC mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	Costo anual de envío para tramitación de DNI y de actas registrales	Miles de USD	674.00	2017	P	674.00				246.00	246.00
					A						
Details											
Means of verification: Registros administrativos de RENIEC.											
Observations: Esta baja de costos operativos se deriva de la sustitución de envíos físicos por transmisión electrónica, habilitada por los nuevos sistemas de información. Fuente: Estudio de Preinversión SNIP, pág. 1265 y 1268 (693 y 696 respectivamente en el pdf).											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la calidad de los SRI

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1 Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	P	0	200	100,000	820,501
		P(a)	0	200	50,000	1,352,976.34
		A	0	0	0	0
1.2 Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	P	0	150	0	32,897
		P(a)	0	150	0	511,624
		A	0	0	0	0
1.3 Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	P	0	10	37,360	25,319,014
		P(a)	0	10	17,360	37,163,244.7
		A	0	0	40,124.96	40,124.96
1.4 Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P	0	31	0	452,897
		P(a)	0	31	0	339,817.4
		A	0	0	0	0
1.5 Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	P	0	45	50,000	245,000
		P(a)	0	45	25,000	174,631.16
		A	0	0	74,631.16	74,631.16
1.6 Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	P	0	20	500,000	3,833,070.84
		P(a)	0	20	200,000	3,430,097.88
		A	0	0	198,103.76	198,103.76
1.7 Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	P	0	1	500,000	1,740,000
		P(a)	0	1	200,000	1,446,838.46
		A	1	1	1,382,212.46	1,382,212.46
1.8 Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	P	0	450	50,000	2,203,897
		P(a)	0	450	25,000	2,250,000
		A	0	0	0	0
1.9 Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P	0	5	50,000	1,571,798
		P(a)	0	5	25,000	2,116,265.37
		A	0	0	73,706.37	73,706.37
1.10 Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	P	0	1	18,572	185,714
		P(a)	0	1	8,572	50,000
		A	0	0	0	0
1.11 Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	# of public officials	P	0	1,200	500,000	1,237,917.2
		P(a)	0	1,200	250,000	160,086
		A	0	0	10,086	10,086
1.12 Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	P	0	433	500,000	2,305,075.83
		P(a)	0	433	250,000	250,000
		A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Mejora del Acceso a los SRI a población de comunidades aisladas

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1 OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	P	0	300	40,909.89	1,841,867.92
		P(a)	0	300	20,909.89	1,146,662.86
		A	0	0	3,894.3	3,894.3
2.2 Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	P	0	16	1,000,000	6,768,499.01
		P(a)	0	16	300,000	1,720,388.83
		A	0	0	117,025.7	117,025.7
2.3 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	P	0	1,000	47,577	4,953,165
		P(a)	0	1,000	27,577	4,105,548.22
		A	0	0	0	0
2.4 OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	P	60	400	412,268.15	985,572.03
		P(a)	0	400	212,268.15	373,346.96
		A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Modernización de los sistemas de gestión del RENIEC

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1 Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	P	0	1	210,702.88	13,182,723.99
		P(a)	0	1	110,702.88	13,296,606.85
		A	0	0	5,829.86	5,829.86
3.2 Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	P	0	1	60,000	285,714
		P(a)	0	1	30,000	125,049
		A	0	0	35,049	35,049
3.3 PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	P	0	1	0	285,714
		P(a)	0	1	0	285,714.29
		A	0	0	0	0
3.4 Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P	0	1	800,000	6,749,437
		P(a)	0	1	300,000	4,774,628.6
		A	0	0	0	0
3.5 Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	P	0	1	200,000	1,135,143.97
		P(a)	0	1	100,000	1,135,143.97
		A	0	0	0	0

Other Cost

Evaluación	P			0	57,142
	P(a)			0	57,142
	A			0	0
Monitoreo y Auditorías	P			0	114,285.73
	P(a)			0	280,000
	A			0	0
Administración	P			1,139,007.48	3,832,001.48
	P(a)			1,139,007.48	3,593,234.82
	A			1,056,292.92	1,346,545.28
Mitigación ambiental	P			0	75,714
	P(a)			0	75,714.29
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			6,216,397.4	80,214,762
	P(a)			3,291,397.4	80,214,762
	A			2,996,956.49	3,287,208.85

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	
Output	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRIVERA	04/05/2021	
	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto		Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021
			Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CRIVERA	04/05/2021
	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando		Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JSALDANA	03/08/2021
	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Oficinas acondicionadas térmicamente	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/08/2021	
	PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/23/2021	
	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/08/2021	
	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRIVERA	04/05/2021	
	Servicios en línea ofrecidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/23/2021	
	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Sistema de información gerencial implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
	Unidades itinerantes equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021	
Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRIVERA	04/05/2021		
Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/08/2021		

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Ventanillas del RENIEC implementadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/30/2021

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination

Others - Technical-Sectorial Dimensions
