

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1231	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/11/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/21
<b>Last Update</b>	04/06/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/16/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Project to Boost Efficiency in Public Investment Management and Public Procurement	<b>Loan Number</b>	4428/OC-PE, 4428/OC-PE-1, 4428/OC-PE-2
<b>Executing Agency</b>	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO , MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	PEREZ RINCON, BELINDA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1231	65,000,000	65,000,000	8,750,000	0	73,750,000	65,000,000	7,516,083.62	11.56%	57,483,916.38
<b>Aggregated</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>8,750,000</b>	<b>0</b>	<b>73,750,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>7,516,083.62</b>	<b>11.56%</b>	<b>57,483,916.38</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

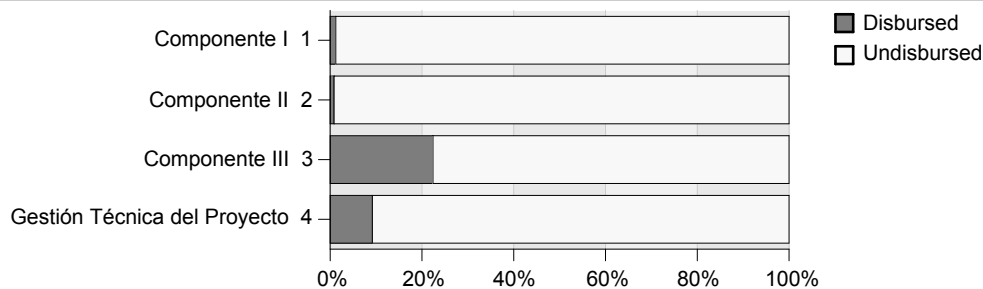

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Disminuir las brechas de inversión (cobertura de servicios e infraestructura) en los sectores salud, educación, agua y saneamiento y transporte

**Observation:** Las brechas de mediano plazo de estos sectores alcanzan 20% del PIB (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 2015)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Población con acceso a seguro de salud.	%	73.00	2015	-	P	93.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3-5 años de edad a educación inicial.	%	80.10	2015	-	P	96.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Tasa de acceso a agua potable.	%	83.80	2015	-	P	98.00
						A	

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

##### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Red Vial Nacional (RVN) pavimentada.	%	87.70	2014	-	P	95.00
						A	

##### Details

**Means of verification:** Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Incremento del porcentaje de proyectos formulados alineados con la reducción de brechas.

**Observation:** Línea Base: Monto de proyectos ejecutados (devengados) alineados con cadenas priorizadas de la inversión pública = S/. 19.645 millones. Monto total de proyectos ejecutados (devengados) = S/. 27.816 millones. Se tomó como proxy de alineamiento a brechas, a los proyectos de inversión pública que están alineados a las cadenas de gasto presupuestal (función-programa-subprograma) priorizadas por brechas, según lo definido por cada sector. Fuente: DGIP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Monto de proyectos ejecutados alineados con brechas / Monto total de proyectos ejecutados.	%	70.60	2016	P		85.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa integral de capacitación = 2.720 funcionarios. La capacitación del programa estará dirigida a funcionarios de la DGIP, y OPMI, UF y UE de 4 sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y agua y saneamiento) de ministerios de línea y los 26 GR. Se espera capacitar a un total de 2.720 funcionarios al final del programa, y certificar al 65% del total de inscritos capacitados. Fuente: DGIP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0.00	2016	P		65.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Aumento del porcentaje de funcionarios mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Número de funcionarias mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0.00	2016	P		35.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> Nota de verificación de la DGIP							
<b>Pro-Gender</b>	Yes			<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas.

**Observation:** Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación en contrataciones públicas	%	0.00	2016	P		65.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Pro-Gender</b>	No			<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

**Specific Development Objectives Nbr. 4:** Incremento de la tasa de ejecución de la inversión pública.

**Observation:** Línea Base: Gasto devengado = S/ 27,2 mil millones. Gasto presupuestado (PIM) = S/ 39,8 mil millones. Fuente: Portal de Consulta amigable.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Gasto devengado	%	68.00	2016	P		80.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

4.0	/ Presupuesto institucional modificado de inversión pública.	%	68.00	2016	A		
-----	--	---	-------	------	---	--	--

#### Details

**Means of verification:** Portal de Consulta Amigable

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 5:** Reducción de la incidencia de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: Toma en consideración el universo de proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
5.0	# de proyectos finalizados con retraso / # de proyectos finalizados.	%	72.00	2016	P		59.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 6:** Reducción de la incidencia de sobrecostos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: Toma en consideración proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
6.0	# de proyectos finalizados con sobrecostos / Número de proyectos finalizados.	%	45.00	2016	P		37.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Mejora de la capacidad del marco institucional**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado	Documento	P	1	5	74,883.67	1,091,170.33
			P(a)	0	9	40,472	999,108
			A	0	0	12,713	12,713
1.2	Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, implementado.	Documento	P	2	10	599,523.71	4,527,432.11
			P(a)	0	10	28,592	5,837,769
			A	0	0	0	0
1.3	Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado	Documento	P	3	11	453,582.12	962,159.38
			P(a)	0	12	72,000	553,987
			A	0	0	60,367	60,367
1.4	Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual	Documento	P	1	2	8,213.33	12,320
			P(a)	0	2	0	3,986
			A	0	0	0	0
1.5	Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social	Documento	P	7	35	736,767.88	2,909,086.36
			P(a)	0	29	92,743	2,186,147
			A	1	1	77,720	77,720
1.6	Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado.	Documento	P	2	10	78,003.26	2,928,328.17
			P(a)	0	6	0	2,849,498
			A	0	0	0	0
1.7	Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado.	Documento	P	0.3	1	241,044	849,187
			P(a)	0.3	1	201,780	997,550.43
			A	0.3	0.3	201,304.16	208,361.24
1.8	Servicio de actualización del portal de OSCE	Servicio de actualización	P		2	48,850	326,400
			P(a)		2	48,850	137,081.8
			A	0	0	42,487.22	42,487.22
1.9	Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado	Documento	P	0.2	1	122,126	780,054
			P(a)	0.2	1	122,126	1,372,314.07
			A	0.1	0.1	466,698.47	505,450.99
1.10	Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado	Software	P		1	0	183,190
			P(a)		1	0	183,190
			A	0	0	0	0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 2 Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1 Base de datos del Banco de Inversiones implementada	Documento	P	5	10	438,102.73	665,094.25
		P(a)	5	16	241,712	381,303
		A	5	5	160,988	160,988
2.2 Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado	Documento	P	3	23	343,712.89	10,900,094.54
		P(a)	0	17	0	9,245,900
		A	0	0	0	0
2.3 Servicio de actualización del portal Invierte.pe	Documento	P	4	4	86,240	86,240
		P(a)	1	3	119,622	140,832
		A	2	2	140,832	140,832
2.4 Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado	Software	P	0.1	1	753,143.61	9,696,753.2
		P(a)	0.1	1	646,764.71	8,896,742.03
		A	0.07	0.07	106,884.88	106,884.88
2.5 Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado	Software	P	0.4	1	131,380	301,212
		P(a)	0.4	1	117,543.6	241,736.31
		A	0.4	0.4	114,706.68	121,749.82
2.6 Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado	Software	P	0.25	1	82,500	324,740
		P(a)	0.25	1	60,000	421,085.86
		A	0.24	0.24	102,166.94	102,166.94
2.7 Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado	Equipamiento	P		1	0	2,160,828.72
		P(a)		1	0	2,555,845.5
		A	0	0	25,555.56	34,212.62
2.8 Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada	Documento	P	8	8	893,586.97	893,586.97
		P(a)	0	8	0	1,000,000
		A	0	0	0	0
2.9 Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado	Documento	P	1	17	36,960	4,243,440
		P(a)	0	12	0	4,082,760
		A	0	0	0	0
2.10 Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado	Documento	P	2	22	330,063.27	723,339.08
		P(a)	0	15	0	3,193,818
		A	0	0	0	0
2.11 Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada	Documento	P	4	32	475,180.61	2,804,732.73
		P(a)	0	22	0	2,261,036
		A	0	0	0	0
2.12 Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada	Documento	P	1	7	36,960	433,920
		P(a)	0	3	0	444,799
		A	0	0	0	0



**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 Mejora de la capacidad del capital humano**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado	Documento	P	4	25	214,565.83	615,454.24
			P(a)	0	22	20,700	419,892
			A	0	0	30,795	30,795
3.2	Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano	Documento	P	2	34	147,872.95	6,985,419.06
			P(a)	0	28	0	7,926,940
			A	0	0	0	0
3.3	Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado	Documento	P	1	22	66,528	1,194,518.48
			P(a)	1	16	66,733	963,187
			A	0	0	44,843	44,843
3.4	Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada	Documento	P		1	143,160	1,502,590
			P(a)		1	126,296.53	1,502,599.99
			A	0	0	171,285.73	206,025.73
3.5	Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado	Documento	P	3	15	2,857,371.75	5,020,062.38
			P(a)	3	18	2,358,544	4,505,436
			A	3	4	2,053,682	3,444,107

**Component Nbr. 4 Gestión técnica y administrativa**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	Administración del proyecto	Informe	P	1	5	2,426,870.6	10,628,647
			P(a)	1	5	1,625,486.56	10,445,456.01
			A	1	2	1,678,944	2,145,158.79

**Total Cost**

Total Cost	P			11,827,193.18	73,750,000
	P(a)			5,989,965.4	73,750,000
	A			5,491,973.64	7,444,863.23

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Administración del proyecto	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/31/2021
	Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Base de datos del Banco de Inversiones implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021	
Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021	

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/16/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
	Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
			Modify Unit of Measure	TEODOROZ	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Unflag contribution to CRF indicator	TEODOROZ	03/29/2021
	Servicio de actualización del portal Invierte.pe	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
Modify Physical EOP P(a) value -			SCOLQUI	03/24/2021	

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	
Output	Servicio de actualización del portal Invierte.pe	Modify Output	caused by a change in the Physical P(a).			
	Servicio de actualización del portal de OSCE	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021	
	Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021	
	Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021	
	Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado		Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/24/2021
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/24/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories
