

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1057	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/07/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/17
<b>Last Update</b>	04/07/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/12/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Production Development for International Integration	<b>Loan Number</b>	2583/OC-ES, 2583/OC-ES-1, 2583/OC-ES-2, 2583/OC-ES-3
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	<b>Sector/Subsector</b>	TD - TRADE
<b>Team Leader</b>	GRANADOS,JAIME	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1057	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	19,387,376.13	64.62%	10,612,623.87
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	19,387,376.13	64.62%	10,612,623.87

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

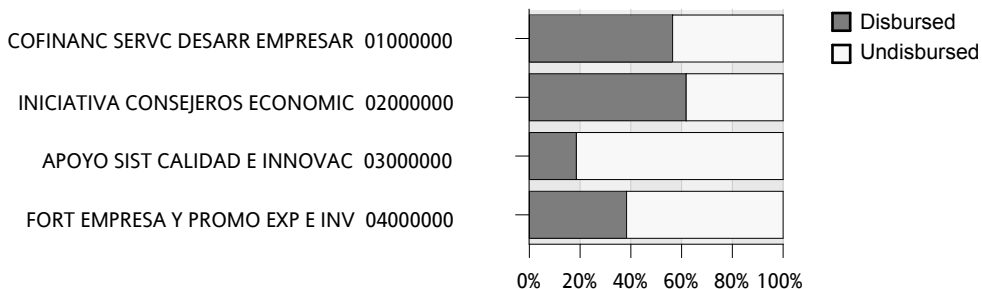

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Se aumentará el ritmo de crecimiento anual de las exportaciones salvadoreñas.

**Observation:** Se espera que las exportaciones hayan crecido un 35% al final del periodo de ejecución, con respecto al año 2009.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Rtmo de crecimiento anual de las exportaciones.	Porcentaje	2.7	2009	P	6.20
					P(a)	6.20
					A	
<b>Details</b>						
<b>Means of verification:</b> Estadísticas de exportaciones del Banco Central de Reservas.						
<b>Observations:</b> La línea de base es el promedio de los 2005-2009: 2.7%. La meta esperada será el promedio de los años de ejecución: 2,2% (2011-2015).						
<b>Pro-Gender</b>	No		<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Base exportable, oferta exportable y mercados de destino de El Salvador incrementados.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Empresas que exportan más de US\$ 500.000 al año.	Empresa	394.0	2009	P			540.00
					P(a)			540.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros del Banco Central de Reservas, MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Productos exportados por valores superiores a los US\$ 500.000 al año.	Producto	466.0	2009	P			561.00
					P(a)			561.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas del MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Mercados de destino de exportaciones superiores a US\$ 500.000 al año.	Mercado	49.0	2009	P			60.00
					P(a)			60.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Registros de control del MINEC.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.4	Tasa de crecimiento de exportación de las MIPYMES apoyadas por los co-financiamientos de SDE.	Porcentaje	10.0	2009	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

**Observations:** Para verificar el cumplimiento de la meta se realizará una evaluación externa con apoyo técnico del BID.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Promoción de exportaciones salvadoreñas aumentada gracias al fortalecimiento de la presencia institucional de El Salvador en los principales países socios comerciales.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
2.1	Consejeros Económicos y Comerciales establecidos en los destinos estratégicos.	Funcionario	0.0	2009	P			12.00
					P(a)			12.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Contratos de los consultores consejeros, plan de trabajo y resultados reportados en el sistema de Balanced Scorecard.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Aumento de la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
3.1	Cambio en la disposición de los empresarios en participar en temas de innovación y calidad, incluyendo grandes empresas.	Porcentaje de disposición favorable	0.0	2009	P			1.00
					P(a)			1.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y/o entrevistas/opinión de expertos

**Observations:** Empresarios están dispuestos a participar en temas de innovación y calidad, incluyendo a las grandes empresas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** Capacidad institucional para el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo exportador aumentada.

**Observation:**

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
4.1	Procesos de desarrollo de exportaciones e inversiones diseñados e implementados: 1) campaña de imagen-país; 2) establecimiento de un programa de gestores de inversión; 3) uso de herramientas para el desarrollo de sectores de exportación; y 4) promoción de	Proceso	0.0	2009	P			4.00
					P(a)			4.00
					A			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informes de las cuatro consultorías y sus respectivos resultados.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr.** 5: Capacidad analítica y de ejecución de la política comercial nacional y la administración de tratados comerciales aumentada.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
5.1	Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.	Puntos	528.0	2009	P			681.00
					P(a)			681.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta a las diferentes agencias de administración de acuerdos comerciales

**Observations:** La línea de base se mejorará en un 29% para alcanzar 681 puntos en el Indicador Básico de Capacidad de Administración de Acuerdos Comerciales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 I. Cofinanciamiento de servicios de desarrollo empresarial (SDE) para MIPYMES**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Estrategia de comunicación para dar a conocer las líneas de apoyo de co-financiamientos de SDE implementada.	Estrategia	P	1	1	37,000	184,000
			P(a)	0	1	125,971.15	183,978.22
			A	0	0	66,687.94	119,797.68
1.2	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Professionals (#)	P	4	20	20,000	53,000
			P(a)	4	147	41,189.69	50,221.65
			A	115	147	32,154.43	40,613.21
1.3	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Adecuación	P	1	2	30,000	60,000
			P(a)	1	3	34,000	25,400
			A	1	2	6,400	6,400
1.4	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Empresa	P	60	200	5,322,000	10,087,000
			P(a)	60	337	5,386,643.49	9,352,268.1
			A	82	337	3,567,834.14	7,319,772.11
1.5	Unidad equipada y fortalecida	Unidad	P		1	7,000	116,000
			P(a)		1	239,336.13	488,132.03
			A	0	0	207,847.37	413,414.55

**Component Nbr. 2 II. Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales (CEC).**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Aplicación informática de monitoreo y seguimiento funcionando	Aplicación	P		1		107,000
			P(a)		1	86,438.21	135,627.59
			A	0	1	90,827.59	97,827.59
2.2	Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales en operación.	Iniciativa	P		1	1,221,000	3,686,000
			P(a)		1	1,363,016	3,257,372.41
			A	1	1	1,360,382.85	2,275,123.64
2.3	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Evaluación	P		1		16,000
			P(a)		1	15,000	15,000
			A	0	0	0	0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 III. Apoyo a la Calidad e Innovación Tecnológica**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1 Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	Obra	P	1	1		1,863,000
		P(a)		1	1,076,067.5	3,283,222.58
		A	0	0	42,724.88	176,612.6
3.2 Estrategia de promoción y comunicación del SSC desarrollada	Estrategia	P		1	57,000	297,000
		P(a)		1	111,336.88	176,438.36
		A	0	0	33,951.51	122,879.11
3.3 Metodología de procesos de normalización desarrollada	Metodología	P		1	17,000	440,000
		P(a)		1	333,690.66	494,566.58
		A	0	0	253,012.99	266,086.3
3.4 Organismo de Acreditación fortalecido	Organismo fortalecido	P		1	78,000	295,000
		P(a)		1	142,361.42	235,014.04
		A	0	0	96,986.08	185,618.7
3.5 Equipo de calibraciones y comparaciones de patrones de trabajo con patrones industriales del CIM funcionando	Equipo	P		1	8,000	70,000
		P(a)		1	25,766.83	73,812.03
		A	0	1	25,766.83	73,812.03
3.6 Talleres de capacitación para organismos de inspección y verificación de calidad impartidos	Taller	P	2	6	16,000	59,000
		P(a)	0	26	29,450	56,326.3
		A	14	26	29,619.16	55,268.46
3.7 Sistema de divulgación de reglamentos técnicos implementado	Sistema diseñado	P		1		10,000
		P(a)		1	242,047.71	0
		A	0	1	0	0
3.8 Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	Sistema	P	1	1	13,000	400,000
		P(a)	1	1	126,846.4	554,000
		A	1	1	200,984.29	460,136.58
3.9 Unidad CNC equipada y fortalecida	Unidad	P		1	101,000	416,000
		P(a)		1	10,000	107,244.83
		A	0	1	28,250	107,244.83

**Component Nbr. 4 IV. Fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones e inversiones.**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1 Estrategia de imagen-país implementada	Estrategia	P	1	1	657,000	1,750,000
		P(a)	0	1	744.69	2,088,879
		A	0	0	144.72	85,184.71
4.2 Programa de Gestores de Inversión en operación.	Programa	P		1	580,000	1,950,000
		P(a)	1	2	574,918.68	1,937,302
		A	0	1	398,074.66	1,163,757.52
4.3 Nuevas empresas exportando	Empresa	P	7	17	632,000	1,997,000
		P(a)	7	17	775,536.91	1,782,687
		A	8	14	551,398.18	1,122,512.95
4.4 Programa de Cultura Exportadora en marcha	Programa	P		1	295,000	1,380,000
		P(a)		1	325,451.62	846,132
		A	1	1	305,566.23	710,245.9

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 5 V. Apoyo a la formulación de Política Comercial y Administración de Tratados Comerciales.**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
5.1 Funcionarios públicos capacitados en los cinco módulos del programa de política comercial	Professionals (#)	P	25	90		102,000
		P(a)	25	131	738	21,648.35
		A	66	131	738	21,648.35
5.2 Programa de Divulgación de los Acuerdos Comerciales implementado.	Programa	P		1	92,000	308,000
		P(a)	1	1	175,592.41	436,580.35
		A		0	172,680.17	389,134.77
5.3 Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Sistema	P		1		252,000
		P(a)	0	1	58,183.57	257,031.31
		A	1	1	58,183.57	241,564.65
5.4 Capacidad de análisis económico de los técnicos y gerentes de la UIE desarrollada	Capacidad desarrollada	P		1	7,000	94,000
		P(a)	2	1	0	61,544.07
		A	0	1	0	55,708.44
5.5 Política Comercial de El Salvador Elaborada	Informe	P		2		20,000
		P(a)	1	1	33,000	33,000
		A	1	1	33,000	33,000
5.6 Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Professionals (#)	P	60	180	68,000	205,000
		P(a)	42	248	14,997.08	61,365.58
		A	75	248	12,856.65	54,329.58
5.7 Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de defensa comercial realizado	Plan	P		1	59,000	164,000
		P(a)	0	1	46,158	94,205.76
		A	0	0	30,577.82	65,095.76
5.8 Aplicación informática para la maximización de bases de datos y elaboración de informes de coyuntura funcionando	Aplicación	P		1		61,000
		P(a)	0	1	0	32,395.04
		A	0	1	0	32,395.04
5.9 Proyecto de Ley de Defensa Comercial y su respectivo Reglamento	Proyecto de Ley	P		1	11,000	101,000
		P(a)	0	1	23,990.98	47,255.49
		A	0.5	0.5	5,990.98	27,255.49
5.10 Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Aplicación	P	1	4	84,000	239,000
		P(a)	0	4	58,826.72	148,891.5
		A	0	0	19,626.72	45,466.5
5.11 Unidad de DATCO equipada y fortalecida	Unidad	P		1	13,000	77,000
		P(a)	0	1	132,333.23	248,389.54
		A	0	1	101,999.51	205,233.29
5.12 Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Professionals (#)	P	25	75	20,000	51,000
		P(a)	0	123	2,496	20,591.51
		A	30	123	2,496	11,285.26
5.13 Metodologías sobre análisis de impacto económico diseñadas	Metodología	P		2		23,000
		P(a)	2	2	10,000	10,000
		A	0	0	0	0
5.14 Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Estudios	P	10	40	1,000	169,000
		P(a)	10	43	5,078.84	228,669.7
		A	13	43	5,274.25	224,489.08

**Other Cost**



Auditorías	P			50,000	200,000
	P(a)			32,930	102,925.42
	A			12,930	22,925.42
Contingencias	P			158,000	654,000
	P(a)			474,000	280,650
	A			0	0
Evaluaciones	P				165,000
	P(a)			140,000	221,454.59
	A			37,351.96	37,351.96
Gestión, Administración y Otros	P			22,000	134,000
	P(a)			93,020	215,893.36
	A			39,337.95	144,127.48
Unidad Ejecutora funcionando	P			360,000	1,357,000
	P(a)			387,250	1,248,881.61
	A			261,600	829,681.61

**Total Cost**

Total Cost	P			10,220,000	30,000,000
	P(a)			12,917,548.8	29,078,137.9
	A			8,093,257.43	17,243,001.15

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Infraestructura física para el establecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC) construida y equipada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Programa de Cultura Exportadora en marcha	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Funcionarios públicos capacitados en los cinco módulos del programa de política comercial	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Equipo de calibraciones y comparaciones de patrones de trabajo con patrones industriales del CIM funcionando	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Aplicación informática de monitoreo y seguimiento funcionando	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Programa de Gestores de Inversión en operación.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Nuevas empresas exportando	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Estrategia de imagen-país implementada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Estudios de análisis económicos elaborados por la UIE	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Programa de Divulgación de los Acuerdos Comerciales implementado.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Iniciativa de Consejeros Económicos y Comerciales en operación.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/31/2017	03/01/2017
Output	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/31/2017	03/01/2017
Output	Unidad equipada y fortalecida	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/14/2017	03/01/2017
Output	Plan de actividades para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la implementación de la normativa de defensa comercial realizado	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Aplicaciones de software para DATCO funcionando	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estrategia de promoción y comunicación del SSC desarrollada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Nuevas iniciativas apoyadas por proyectos de SDE co-financiado	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Representantes del Sector Privado capacitados en los cinco módulos del programa de Política Comercial	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Unidad equipada y fortalecida	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Metodología de procesos de normalización desarrollada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Evaluación Intermedia de la Iniciativa CECT realizada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Empleados públicos y privados capacitados en solución de controversias	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Unidad CNC equipada y fortalecida	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Adecuaciones al Sistema informático de gestión de los co-financiamientos de SDE	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/14/2017	03/01/2017
Output	Proyecto de Ley de Defensa Comercial y su respectivo Reglamento	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Unidad de DATCO equipada y fortalecida	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Sistema Nacional de Innovación Tecnológica funcionando	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Capacidad de análisis económico de los técnicos y gerentes de la UIE desarrollada	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Organismo de Acreditación fortalecido	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Funcionarios del MINEC capacitados en la gestión de los co-financiamientos de SDE.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Talleres de capacitación para organismos de inspección y verificación de calidad impartidos	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/20/2017	03/01/2017
Output	Talleres de capacitación para organismos de inspección y verificación de calidad impartidos	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	01/30/2017	03/01/2017
Output	Funcionarios públicos capacitados en los cinco módulos del programa de política comercial	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
Output	Sistema de información de acuerdos comerciales para la promoción de oportunidades de exportación, con su respectiva aplicación informática para el registro y control de posiciones de negociación desarrollado e implementado.	Modify Output	Información actualizada de acuerdo a la ejecución jul - dic 2016. Reuniones de seguimiento con UE.	02/22/2017	03/01/2017
